

DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE D'EAU

Entreprise:	CISSE
Client:	GAEC DE LA DENISERIE La Deniserie 72110 BEAUFAY
Maître d'oeuvre:	IGEFOR ENVIRONNEMENT 26 le Tertre 35580 GUIGNEN
Exploitant:	GAEC DE LA DENISERIE La Deniserie 72110 BEAUFAY

Code National BSS :

N° Déclaration ** :

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : La Deniserie

72110 BEAUFAY

Coordonnées : **Longitude** 500 295 **Latitude** 6 785 112 **Altitude :** 67.00 m
Zone Lambert-93 métrique

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 15/06/2022

Resp. M. Ouvrage :

Date fin de l'ouvrage : 20/06/2022

Resp. M. Oeuvre :

Machine :

Resp. Chantier :

Date début pompage :

Niveau statique non perturbé : 0.00 m

Date fin de pompage :

Débit Maxi. d'essai : 0.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées :

Rabattement correspondant : 0.00 m

Notes :

TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU

Client:	GAEC DE LA DENISERIE		
Maître d'oeuvre:	IGEFOR ENVIRONNEMENT		
Lieu de l'ouvrage :	La Deniserie		
	72110	BEAUFAY	

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	49.00	Crétacé : Marnes de Ballon ou Argile glauconieuse à minéral de fer (Albien supérieur-Cénomanién inférieur)
49.00	120.00	Sables et marnes du Cénomanién

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	120.00	12"1/4	311.00	Rotary	Boue

* Reconnaissance

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	60.00	5"1/2	140.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
60.00	110.00	5"1/2	140.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes		
110.00	120.00	5"1/2	140.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		

REEMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	50.00	5"1/2	140.00	Ciment	Clk	Sous pression			
50.00	120.00	5"1/2	140.00	Gravier	Graviers de Loire	Gravitaire	Concasse		

ACCESSOIRE

De	à	Type d'accessoire
2.00	2.00	Centreur
10.00	10.00	Centreur
20.00	20.00	Centreur
30.00	30.00	Centreur

FORAGE D'EAU

Client :

GAEC DE LA DENISERIE

Maitre d'oeuvre :

IGEFOR ENVIRONNEMENT

Localisation de l'ouvrage :

La Deniserie

72110

BEAUFAY

Travaux réalisés :

du : 15/06/2022 au : 20/06/2022

1/1

Coordonnées de l'ouvrage :

Lambert-93 métrique

Longitude (X):

500 295

Latitude (Y):

6 785 112


Altitude sol (Z):

+67,000 m

Echelle : 1/603

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1

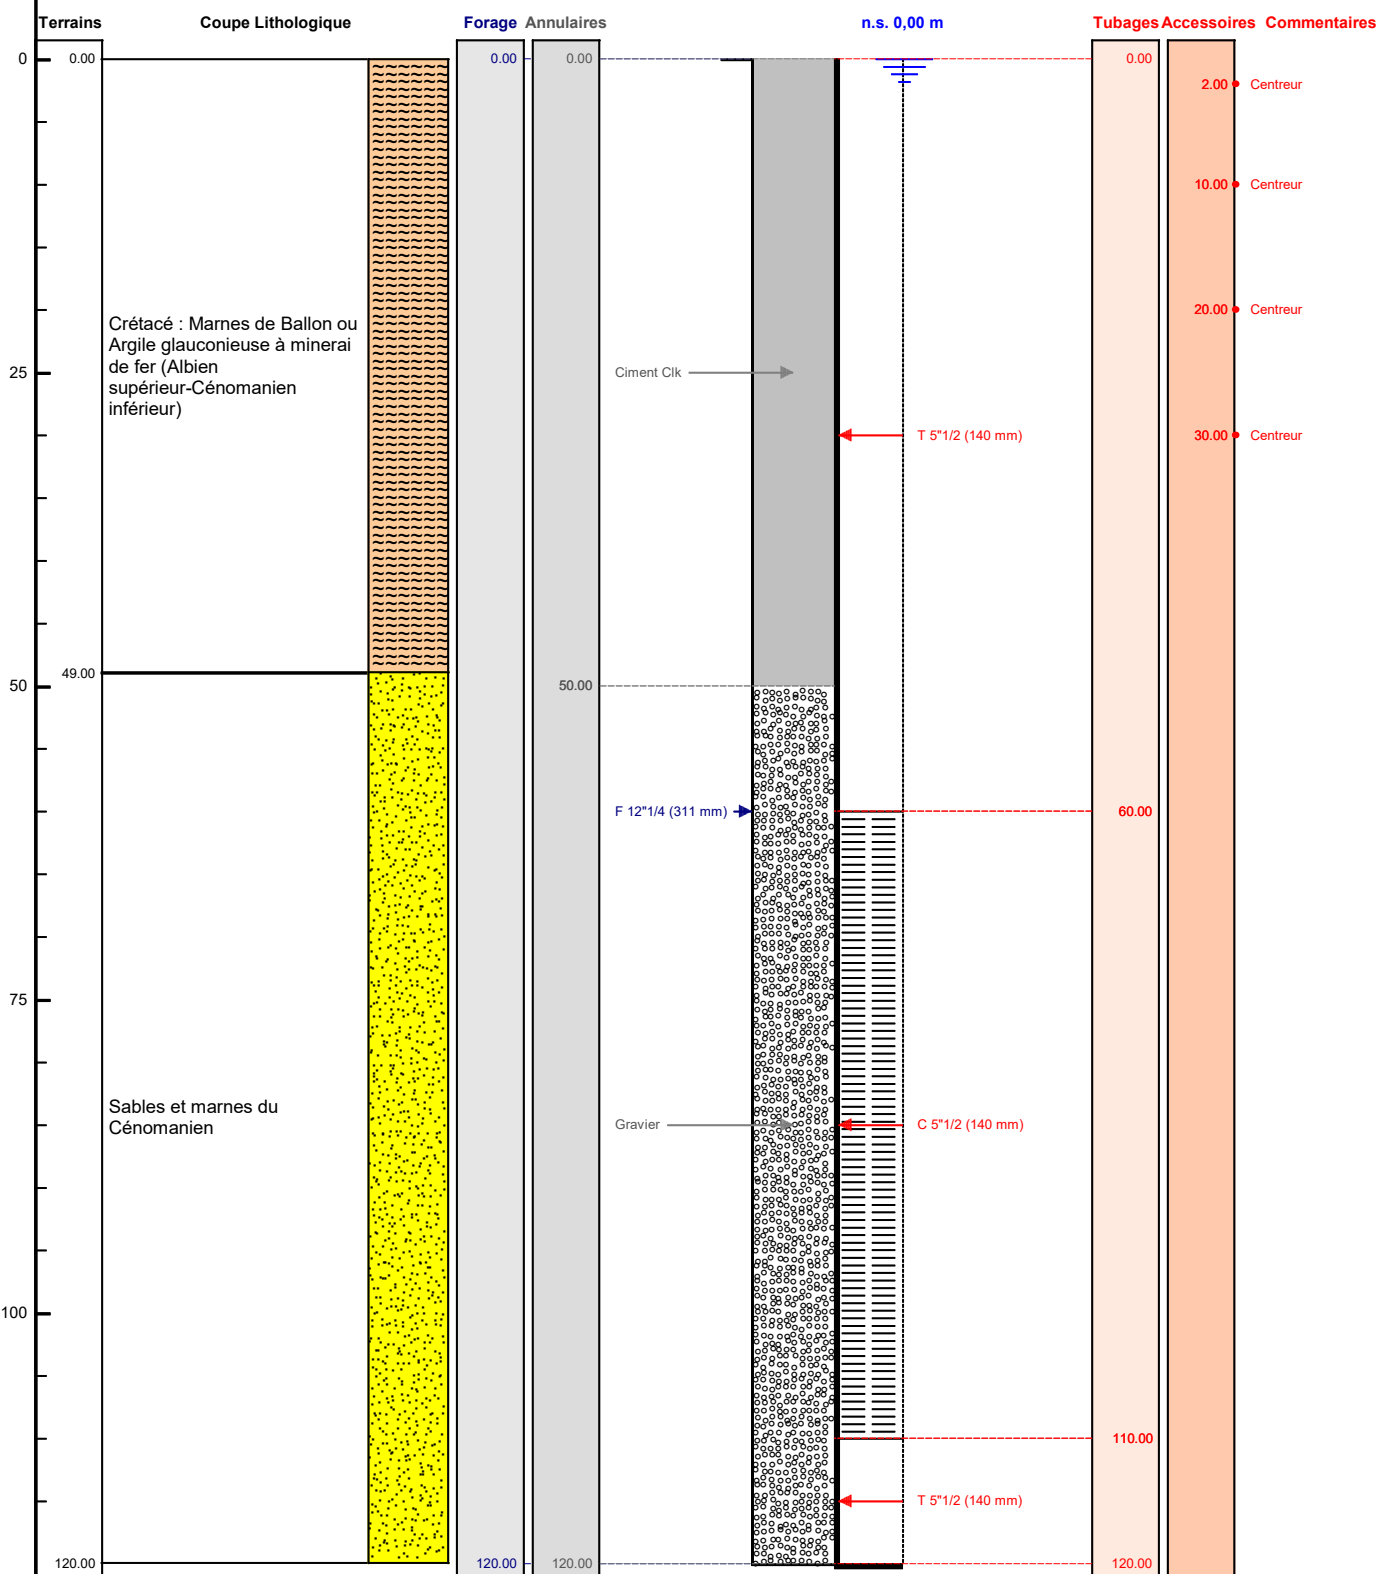

Le/...../..... à

CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE

Tampon et signature du chef d'entreprise
