

TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU

Client: EARL BOIS ROBERT

Maître d'oeuvre: IGEFOR ENVIRONNEMENT

Lieu de l'ouvrage : Bois robert

53340 PREAUX

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	10.00	Alluvions anciennes : Sables et graviers des plateaux, d'âge pliocène présumé, souvent empâtés d'argile ocre à rouge,
10.00	100.00	Carbonifère : Formations volcaniques : Tufs spilitiques

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	10.00	10"5/8	270.00	M.f.t.	Air
10.00	100.00	7"	178.00	M.f.t.	Air

* Reconnaissance

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	50.00	5"1/2	140.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
50.00	100.00	5"1/2	140.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes	1.00	

REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	20.00	5"1/2	140.00	Ciment	Cpa 55	Sous pression			

ACCESSOIRE

De	à	Type d'accessoire
20.00	21.00	Packer

FORAGE D'EAU

Client :

EARL BOIS ROBERT

Maitre d'oeuvre :

IGEFOR ENVIRONNEMENT

Localisation de l'ouvrage :

Bois robert

53340 PREAUX

Travaux réalisés :
du : 08/02/2023 au : 08/02/2023

1/1


Coordonnées de l'ouvrage :

Lambert-93 métrique
Longitude (X): 440 585
Latitude (Y): 6 764 123
Altitude sol (Z): +72,000 m

Echelle : 1/503

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1

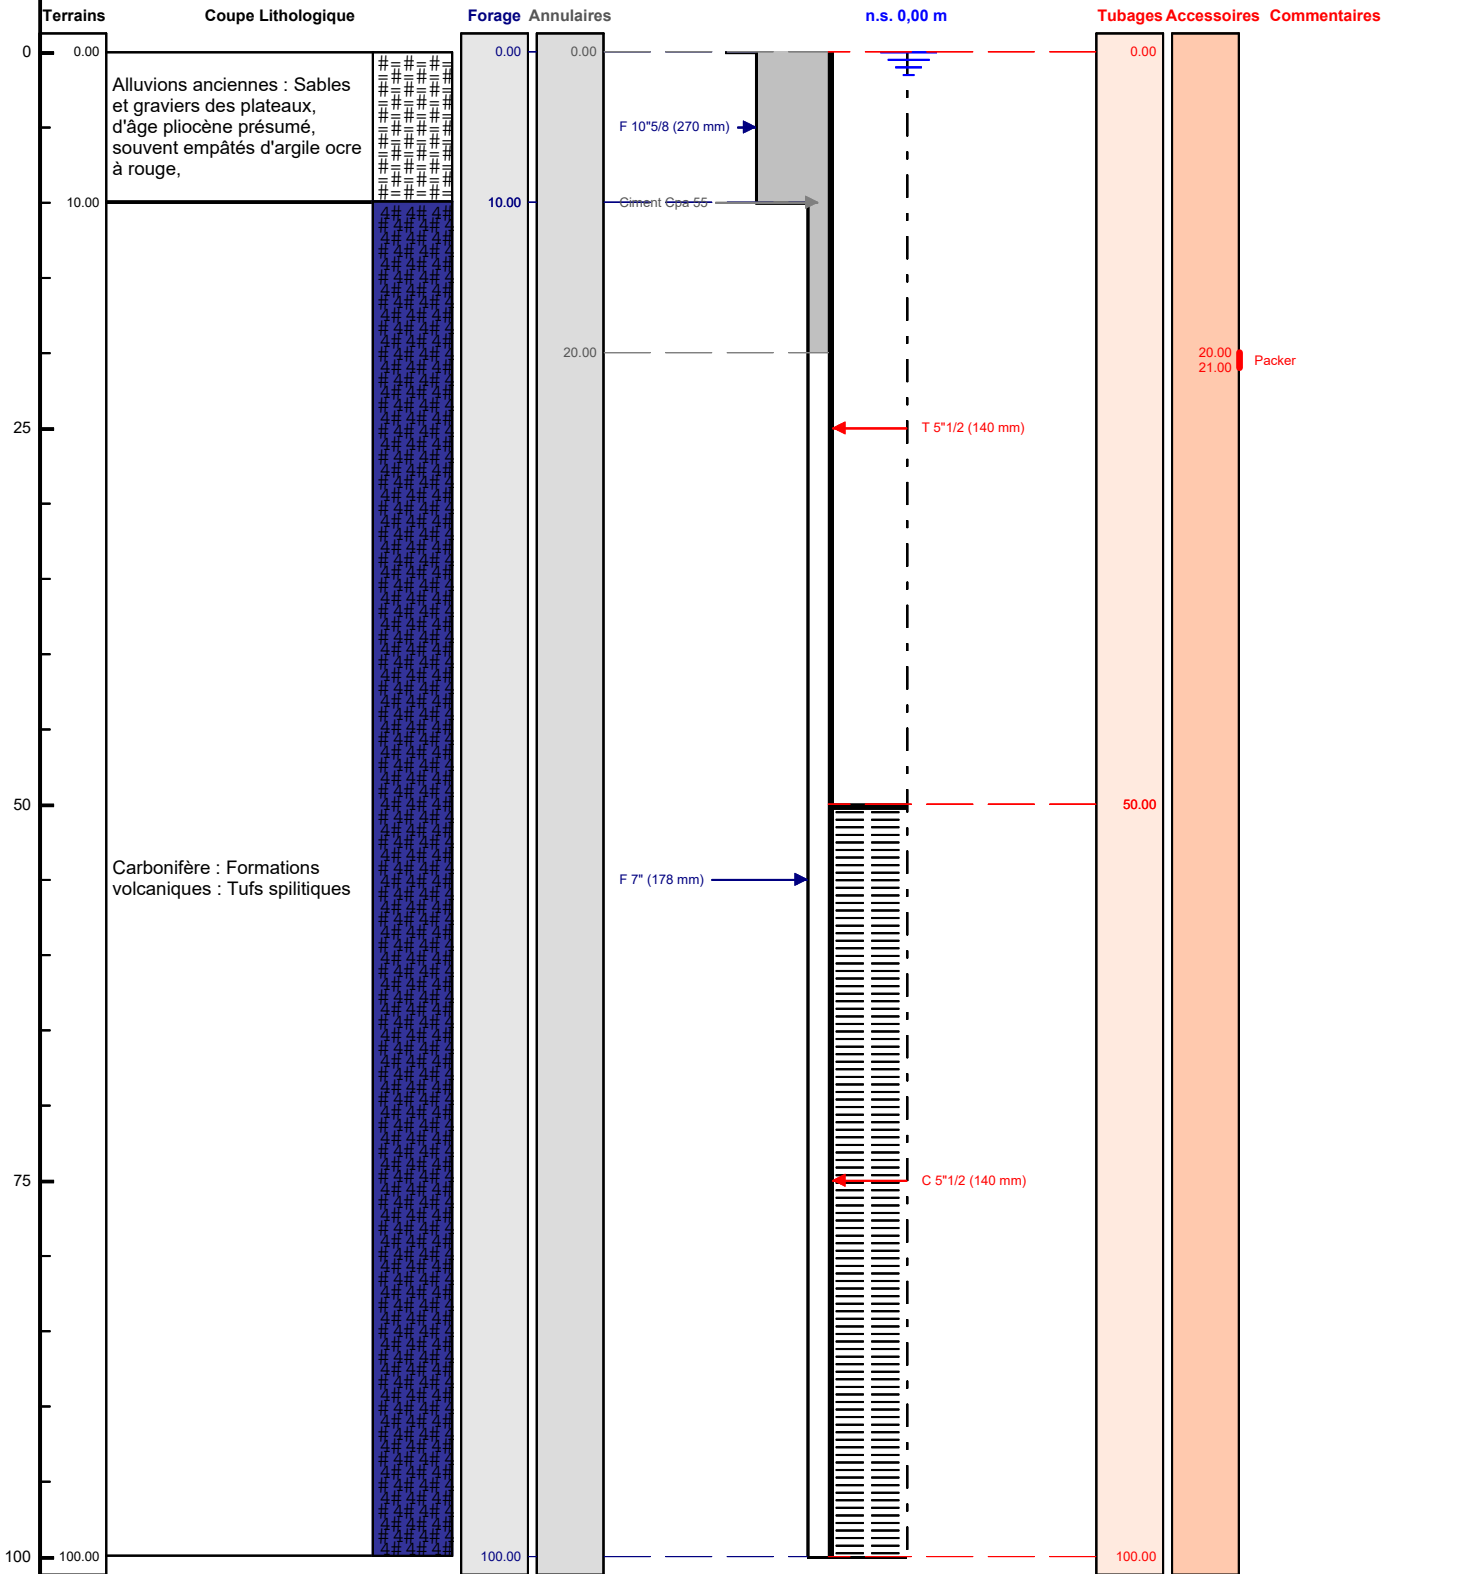

Le/...../..... à
CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE
Tampon et signature du chef d'entreprise
