

DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE

Entreprise:	BONNIER FORAGES
Client:	GAEC DES CARRIERES La Pervençhère 44520 ISSE
Maître d'oeuvre:	IGEFOR 35580 GUIGNEN
Exploitant:	GAEC DES CARRIERES La Pervençhère 44520 ISSE

Code National BSS :

N° Déclaration ** :

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : La Pervençhère
44520 ISSE

Coordonnées : **Longitude** 361 622 **Latitude** 6 731 338 **Altitude :** 42.00 m
Zone Lambert-93 métrique

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 01/12/2023

Resp. M. Ouvrage :

Date fin de l'ouvrage : 02/12/2023

Resp. M. Oeuvre :

Machine : ECOFORE 903

Resp. Chantier :

Date début pompage : **Niveau statique non perturbé :** 0.00 m

Date fin de pompage : **Débit Maxi. d'essai :** 0.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées : **Rabattement correspondant :** 0.00 m

Notes :

TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE

Client:	GAEC DES CARRIERES		
Maître d'oeuvre:	IGEFOR		
Lieu de l'ouvrage :	La Pervençère		
	44520	ISSE	

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	10.00	Limons
10.00	100.00	Alternances d'argilites noires ou bigarrées de quartzites blancs à quartz étirés et de grès séricitiques jaunes

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	10.00	10"	254.00	M.f.t.	Air
10.00	100.00	7"	178.00	M.f.t.	Air

* Reconnaissance

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	30.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
30.00	90.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes		
90.00	100.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		

REPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	12.00	4"7/8	125.00	Ciment	Cpa 55	Sous pression			

FORAGE

Travaux réalisés :
du : 01/12/2023 au : 02/12/2023

1/1


Client : GAEC DES CARRIERES
Maitre d'oeuvre : IGEFOR
Localisation de l'ouvrage : La Pervençère
 44520 ISSE

Coordonnées de l'ouvrage :
 Lambert-93 métrique
 Longitude (X): 361 622
 Latitude (Y): 6 731 338
 Altitude sol (Z): +42,000 m

Echelle : 1/503

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1

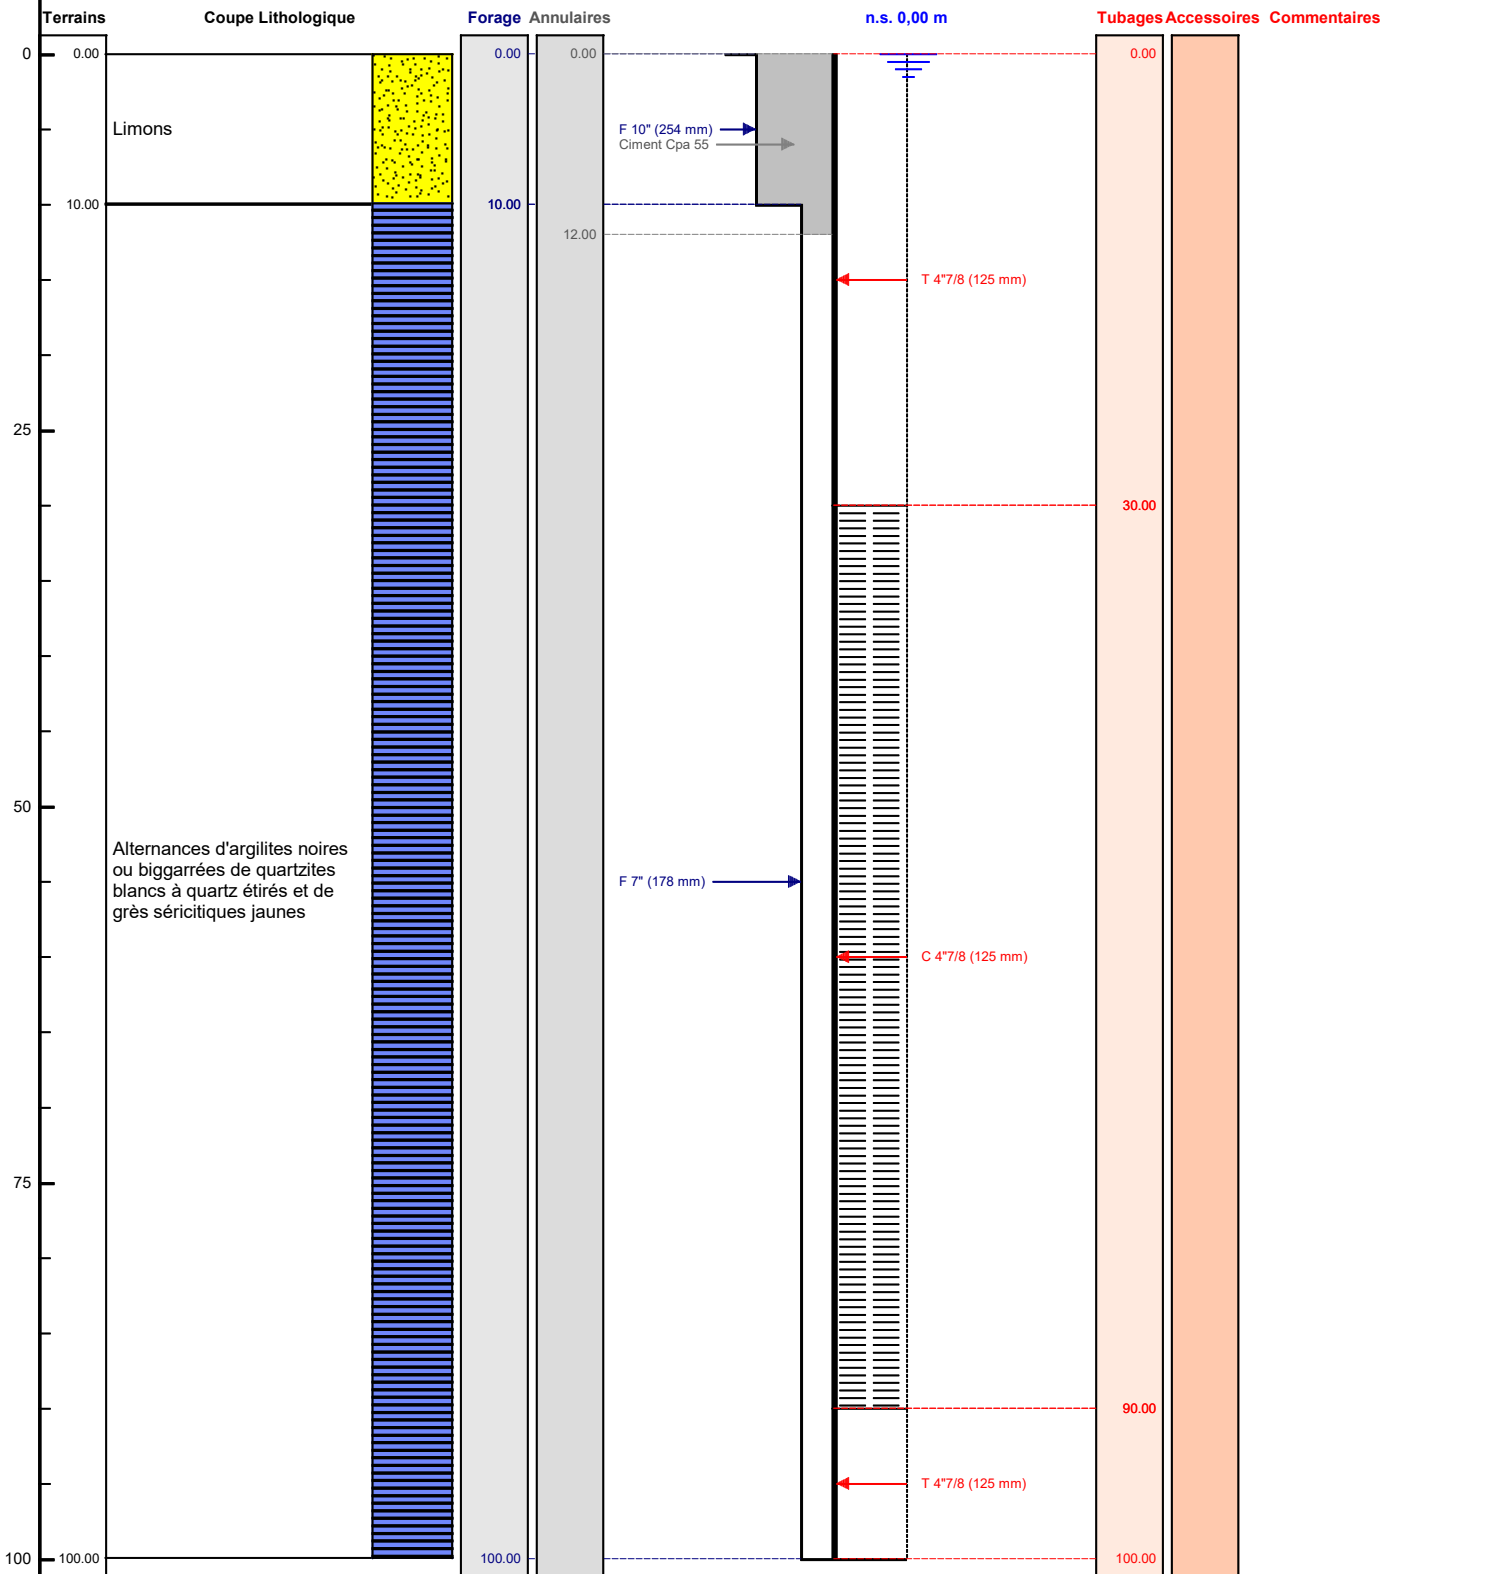

Le/...../..... à
 CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE
 Tampon et signature du chef d'entreprise
