

TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU

Client: EARL DES MOUTONS NOIRS

Maître d'oeuvre: IGEFOR ENVIRONNEMENT

Lieu de l'ouvrage : 4 bis la Sépellière

44110 ERBRAY

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	12.00	Altération gréseuse
12.00	60.00	Grès armoricain supérieur (Areginien)

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	12.00	10"	254.00	M.f.t.	Air
12.00	60.00	7"	178.00	M.f.t.	Air

* Reconnaissance

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	20.00	5"1/2	140.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
20.00	60.00	5"1/2	140.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes	1.00	

REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	20.00	5"1/2	140.00	Ciment	Clk	Sous pression			

ACCESSOIRE

De	à	Type d'accessoire
20.00	20.00	Packer

FORAGE D'EAU

Client :

EARL DES MOUTONS NOIRS

Maitre d'oeuvre :

IGEFOR ENVIRONNEMENT

Localisation de l'ouvrage :

44110 ERBRAY

Travaux réalisés :

du : 01/06/2021 au : 06/06/2021

1/1

Coordonnées de l'ouvrage :

Lambert-93 métrique

Longitude (X):

372 489

Latitude (Y):

6 741 641


Altitude sol (Z):

+79,000 m

Echelle : 1/302

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1

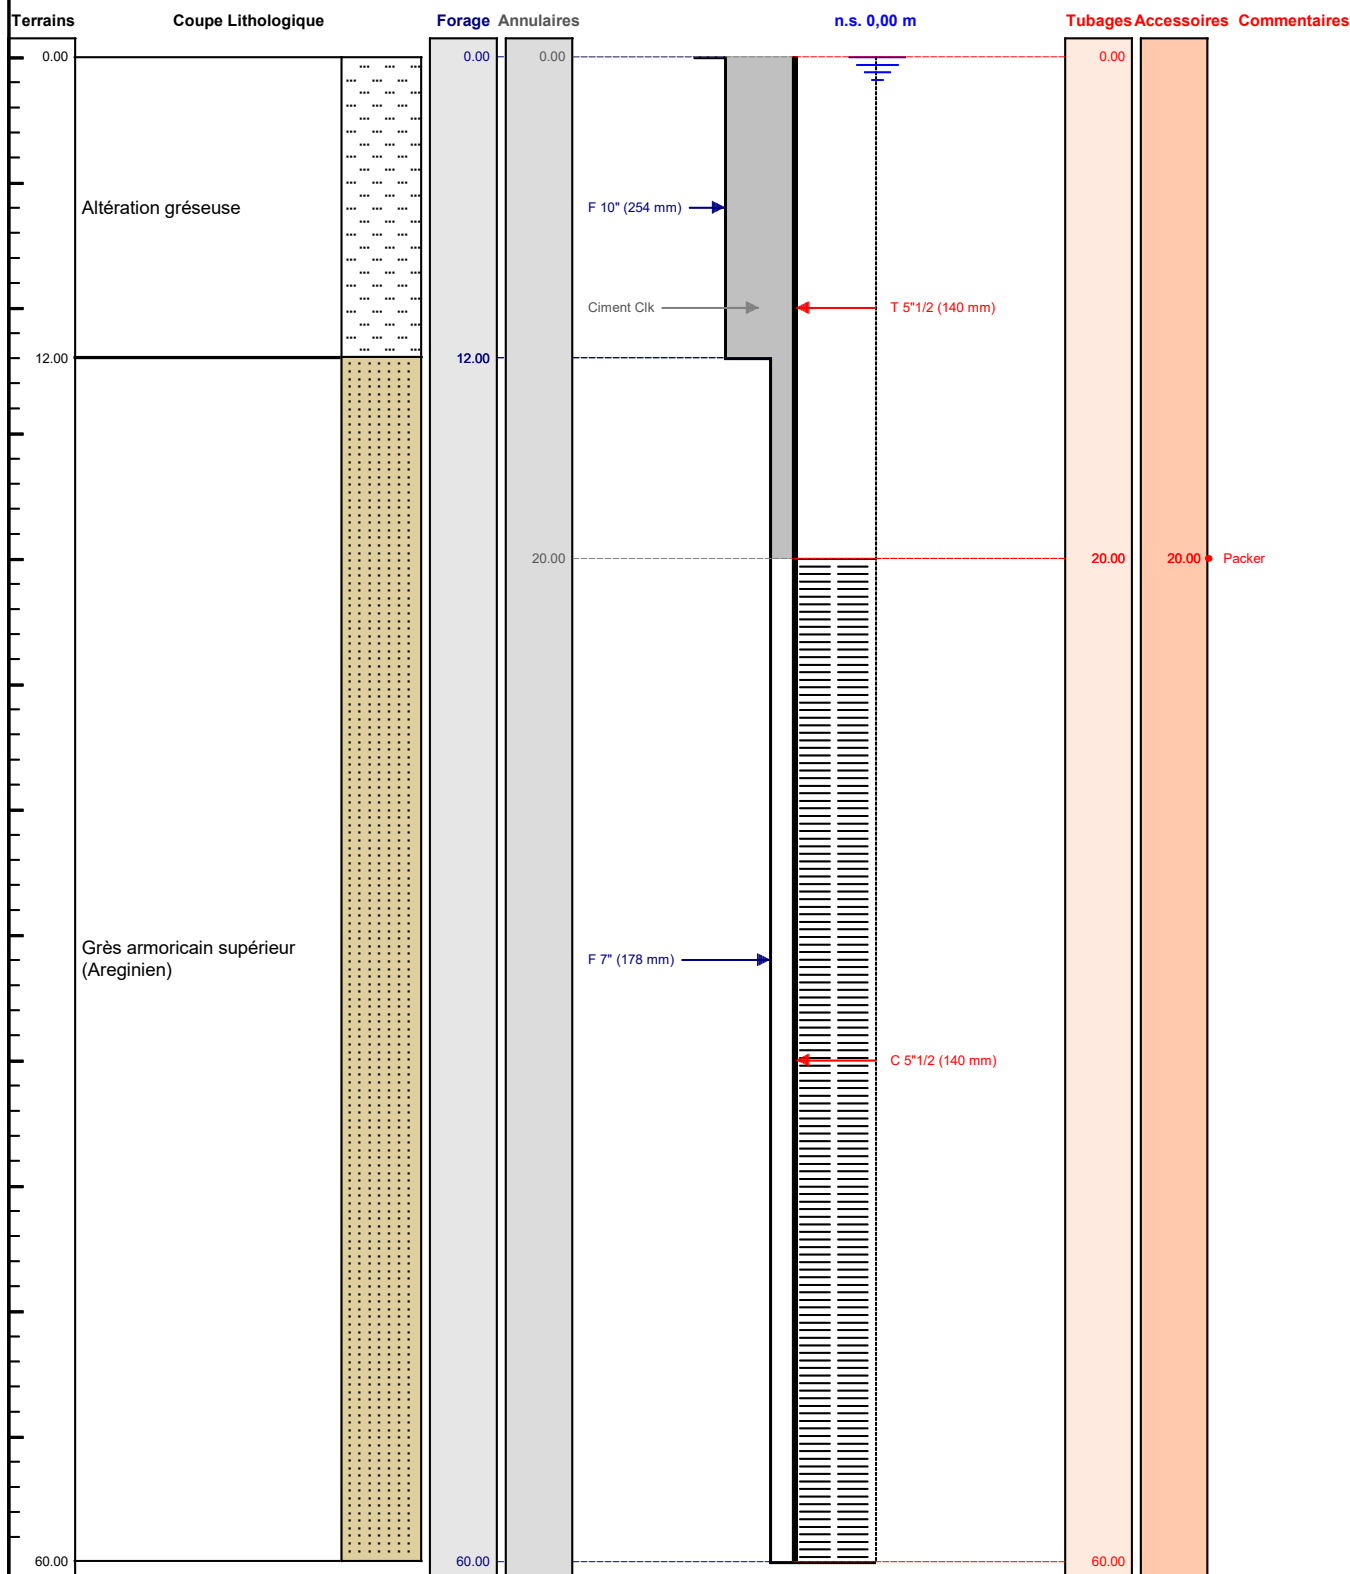

Le/...../..... à

CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE

Tampon et signature du chef d'entreprise
