

DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE D'EAU

Entreprise:	BONNIER
Client:	GAEC DE MARLAND 53 MARLAN 44117 ST ANDRE DES EAUX
Maître d'oeuvre:	IGEFOR ENVIRONNEMENT 26 le Tertre 35580 GUIGNEN
Exploitant:	26 le Tertre 35580 GUIGNEN

Code National BSS :

N° Déclaration ** :

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : Troffigué

44350 GUERANDE

<u>Coordonnées :</u>	Longitude	292 808	Latitude	6 710 323	<u>Altitude :</u>	12.00 m
	Zone	Lambert-93 métrique				

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 01/10/2021

Resp. M. Ouvrage :

Date fin de l'ouvrage : 10/10/2021

Resp. M. Oeuvre :

Machine :

Resp. Chantier :

<u>Date début pompage :</u>	<u>Niveau statique non perturbé :</u>	0.00 m
------------------------------------	--	--------

<u>Date fin de pompage :</u>	<u>Débit Maxi. d'essai :</u>	0.00 m3/h
-------------------------------------	-------------------------------------	-----------

<u>Nombre de nappes identifiées :</u>	<u>Rabattement correspondant :</u>	0.00 m
--	---	--------

Notes :

TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU

Client:	GAEC DE MARLAND		
Maître d'oeuvre:	IGEFOR ENVIRONNEMENT		
Lieu de l'ouvrage :	Troffigué		
	44350	GUERANDE	

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	10.00	Arène granitique
10.00	120.00	Roches métamorphiques : Groupe de l'estuaire de la Vilaine : Micaschiste à muscovite et chlorite primaires, avec biotite, grenat e

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	12.00	10"	254.00	M.f.t.	Air
12.00	120.00	6"1/2	165.00	M.f.t.	Air

* Reconnaissance

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	12.00	7"5/8	193.00	0.00		Acier-api	Tube-plein		

FORAGE D'EAU

Client :

GAEC DE MARLAND

Maitre d'oeuvre :

IGEFOR ENVIRONNEMENT

Localisation de l'ouvrage :

Troffigné

44350

GUERANDE

Travaux réalisés :

du : 01/10/2021 au : 10/10/2021

1/1

Coordonnées de l'ouvrage :

Lambert-93 métrique

Longitude (X):

292 808

Latitude (Y):

6 710 323


Altitude sol (Z):

+12,000 m

Echelle : 1/603

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1

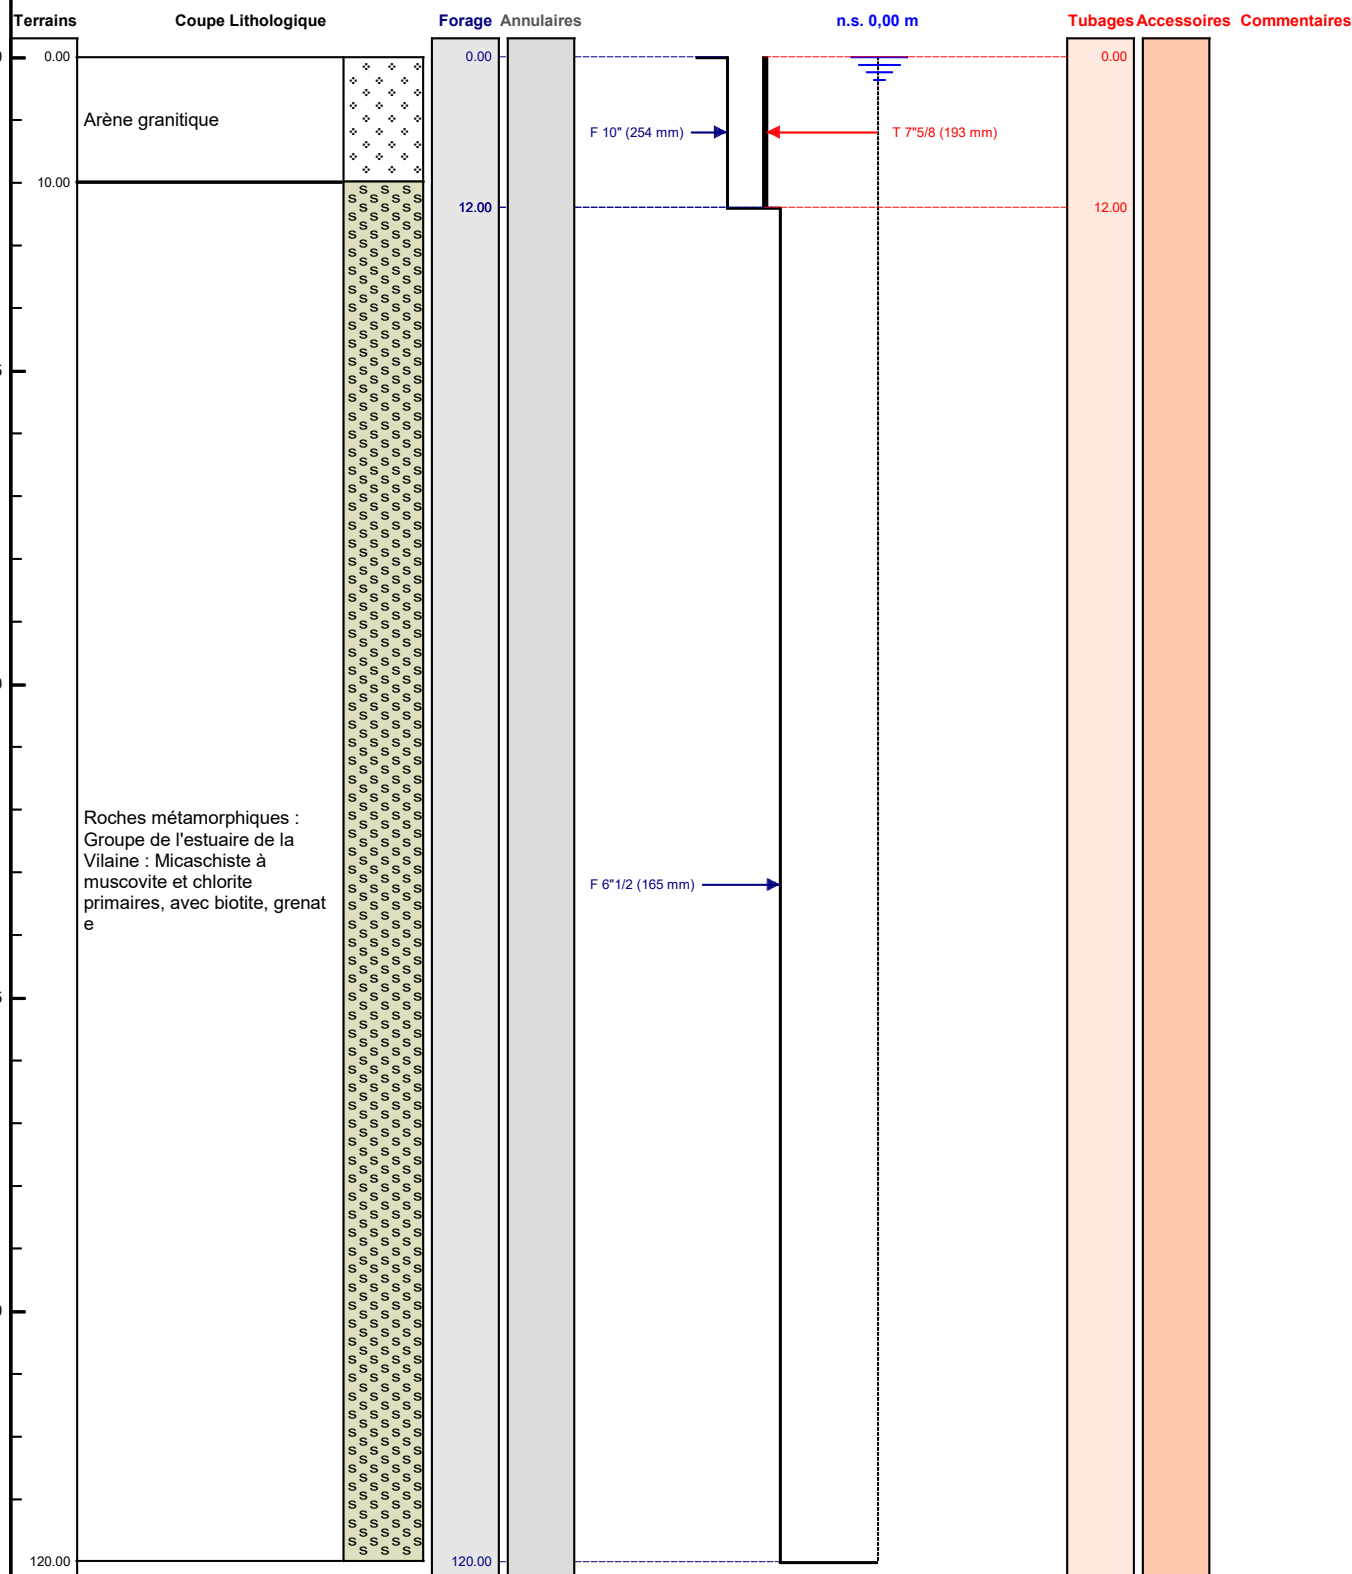

Le/...../..... à

CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE

Tampon et signature du chef d'entreprise
