

# DOSSIER TECHNIQUE

## FORAGE D'EAU

Entreprise:	INCONNU A CE STADE
Client:	GAEC DES LANDES Toubriant 44390 PUCEUL
Maître d'oeuvre:	IGEFOR ENVIRONNEMENT 26 le Tertre 35580 GUIGNEN
Exploitant:	GAEC DES LANDES Toubriant 44390 PUCEUL

Code National BSS :

N° Déclaration \*\* :

Police de l'eau \* :

\* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

\*\* N° d'enregistrement de déclaration préalable

**Lieu de l'ouvrage :** Toubriant  
44390 PUCEUL

**Coordonnées :**      **Longitude**    355 435      **Latitude**    6 724 236      **Altitude :**      51.00    m  
**Zone**    Lambert-93 métrique

**Nombre de forages :** 1

**Date début de l'ouvrage :** 01/11/2021

**Resp. M. Ouvrage :**

**Date fin de l'ouvrage :** 02/11/2021

**Resp. M. Oeuvre :**

**Machine :**

**Resp. Chantier :**

**Date début pompage :**      **Niveau statique non perturbé :**      0.00    m

**Date fin de pompage :**      **Débit Maxi. d'essai :**      0.00    m3/h

**Nombre de nappes identifiées :**      **Rabattement correspondant :**      0.00    m

**Notes :**

## TRONCONS de L'OUVRAGE

## FORAGE D'EAU

Client:	GAEC DES LANDES		
Maître d'oeuvre:	IGEFOR ENVIRONNEMENT		
Lieu de l'ouvrage :	Toubriant		
	44390	PUCEUL	

## LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	10.00	Altération argileuse
10.00	85.00	Llandovérien (S1) : Phtanites de Clégreux

## FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	10.00	10"	254.00	M.f.t.	Air
10.00	85.00	7"	178.00	M.f.t.	Air

\* Reconnaissance

## TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	30.00	5"1/2	140.00	0.00		P.v.c.-lisse	Tube-plein		
30.00	70.00	5"1/2	140.00	0.00		P.v.c.-lisse	Crepine fentes		
70.00	85.00	5"1/2	140.00	0.00		P.v.c.-lisse	Tube-plein		

## REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	12.00	5"1/2	140.00	Ciment	Clk	Sous pression			

# FORAGE D'EAU

Client :

GAEC DES LANDES

Maitre d'oeuvre :

IGEFOR ENVIRONNEMENT

Localisation de l'ouvrage :

Toubriant  
44390 PUCEUL

Travaux réalisés :

du : 01/11/2021 au : 02/11/2021

1/1

Coordonnées de l'ouvrage :

Lambert-93 métrique

Longitude (X): 355 435


Latitude (Y): 6 724 236

Altitude sol (Z): +51,000 m

Echelle : 1/427

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1

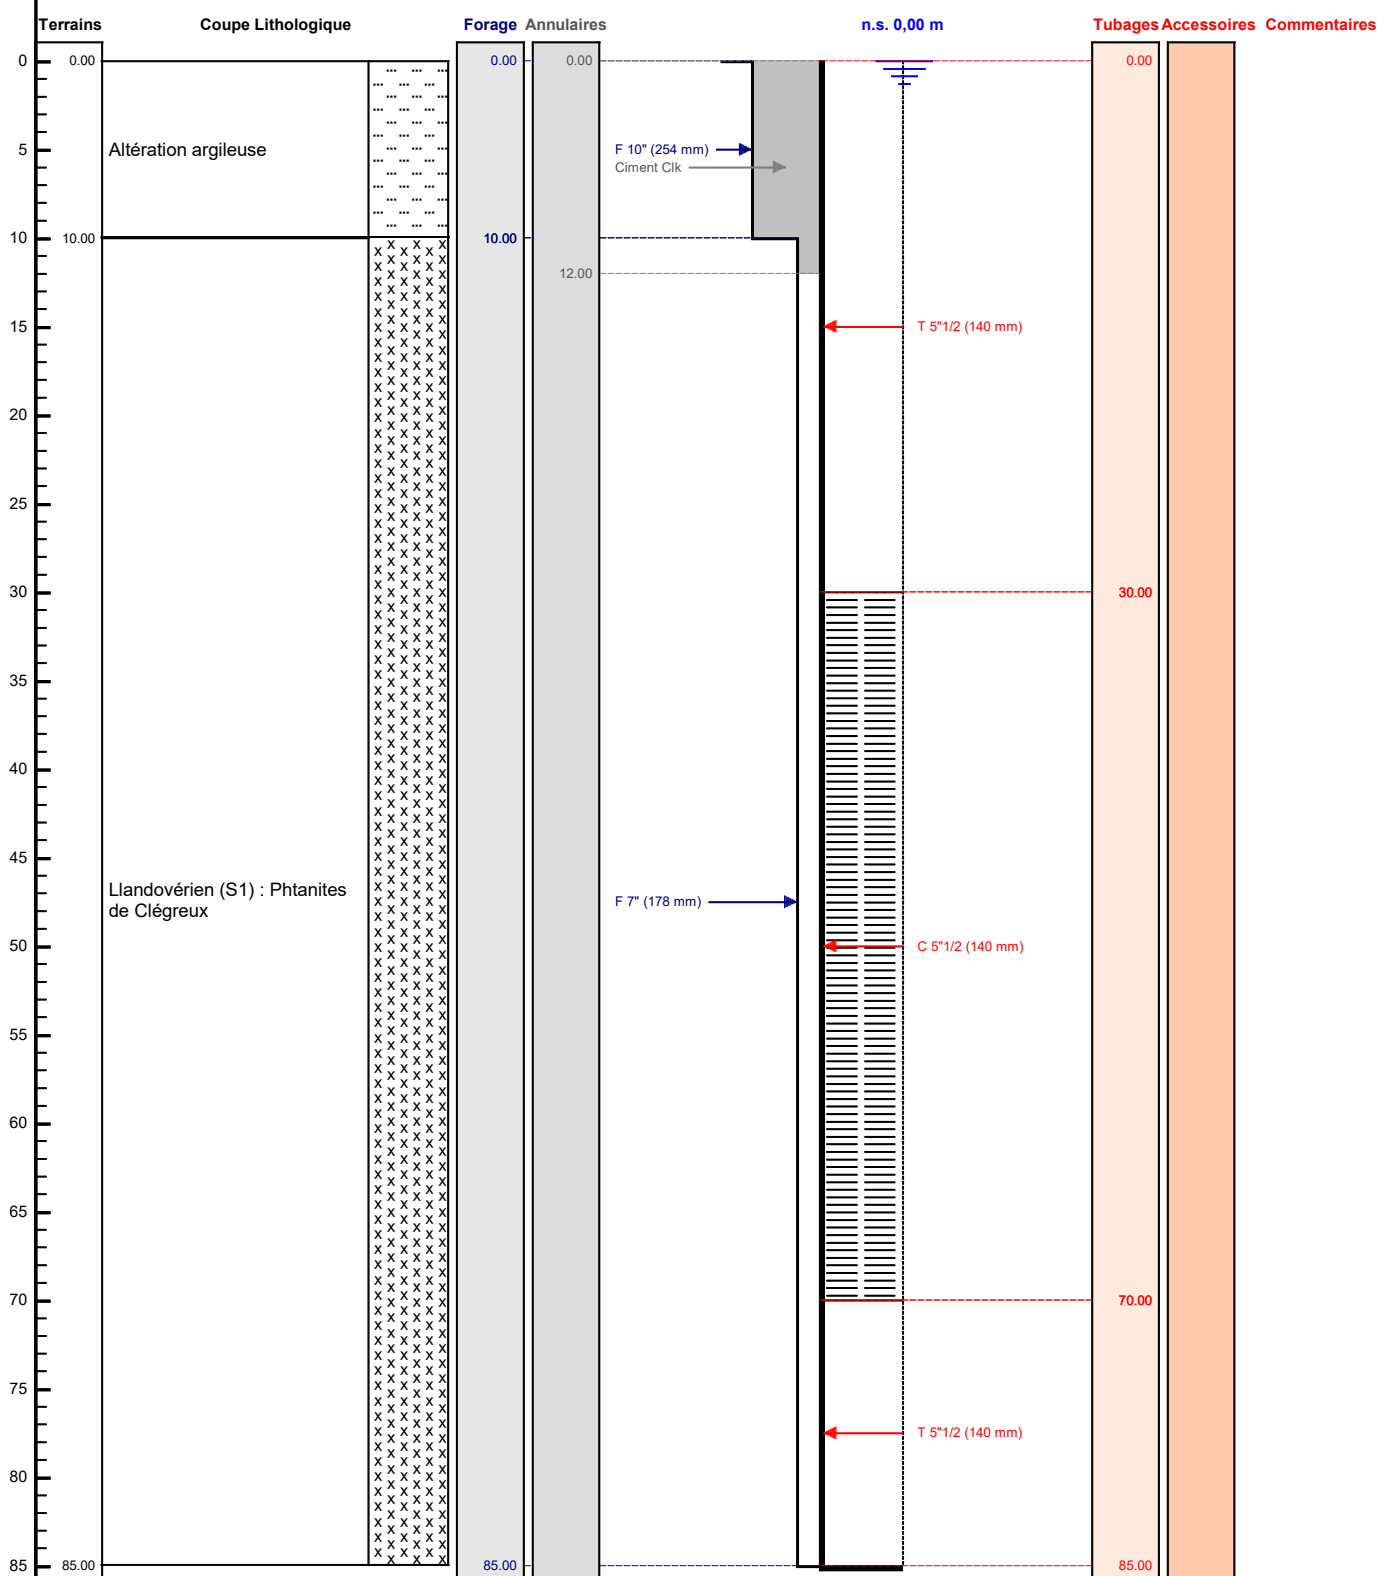

Le ...../...../..... à .....

CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE

Tampon et signature du chef d'entreprise
