

DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE D'EAU

Entreprise:	BONNIER
Client:	EI PIEERE L'HOUTELLIER 7, la voliais 44130 BOUVRON
Maître d'oeuvre:	IGEFOR ENVIRONNEMENT 26 le Tertre 35580 GUIGNEN
Exploitant:	EI PIEERE L'HOUTELLIER 7, la voliais 44130 BOUVRON

Code National BSS :

N° Déclaration ** :

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : 7, la voliais
44130 BOUVRON

Coordonnées : **Longitude** 331 235 **Latitude** 6 715 255 **Altitude :** 21.00 m
Zone Lambert-93 métrique

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 01/03/2022 **Resp. M. Ouvrage :**

Date fin de l'ouvrage : 03/03/2022 **Resp. M. Oeuvre :**

Machine : **Resp. Chantier :**

Date début pompage : **Niveau statique non perturbé :** 0.00 m

Date fin de pompage : **Débit Maxi. d'essai :** 0.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées : **Rabatement correspondant :** 0.00 m

Notes :

TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU

Client: EI PIEERE L'HOUTELLIER

Maître d'oeuvre: IGEFOR ENVIRONNEMENT

Lieu de l'ouvrage : 7, la voliais

44130 BOUVRON

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	15.00	Aréne schisteuse
15.00	80.00	Orthogneiss de Saint-Mars-du-Désert (feuille Ancenis)

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	12.00	10"5/8	270.00	M.f.t.	Air
12.00	80.00	7"	178.00	M.f.t.	Air

* Reconnaissance

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	24.00	5"1/2	140.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein	1.00	
24.00	36.00	5"1/2	140.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes		
36.00	40.00	5"1/2	140.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
40.00	44.00	5"1/2	140.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes		
44.00	48.00	5"1/2	140.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
48.00	52.00	5"1/2	140.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes		
52.00	56.00	5"1/2	140.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
56.00	60.00	5"1/2	140.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes		
60.00	64.00	5"1/2	140.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
64.00	68.00	5"1/2	140.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes		
68.00	80.00	5"1/2	140.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		

REPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	12.00	5"1/2	140.00	Ciment	Cpa 55	Sous pression			

ACCESSOIRE

De	à	Type d'accessoire
12.00	12.00	Packer

FORAGE D'EAU

Client :

EI PIERRE L'HOUTELLIER

Maitre d'oeuvre :

IGEFOR ENVIRONNEMENT

Localisation de l'ouvrage :

44130 BOUVRON

Travaux réalisés :

du : 01/03/2022 au : 03/03/2022

1/1

Coordonnées de l'ouvrage :

Lambert-93 métrique

Longitude (X):

331 235

Latitude (Y):

6 715 255


Altitude sol (Z):

+21,000 m

Echelle : 1/402

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1

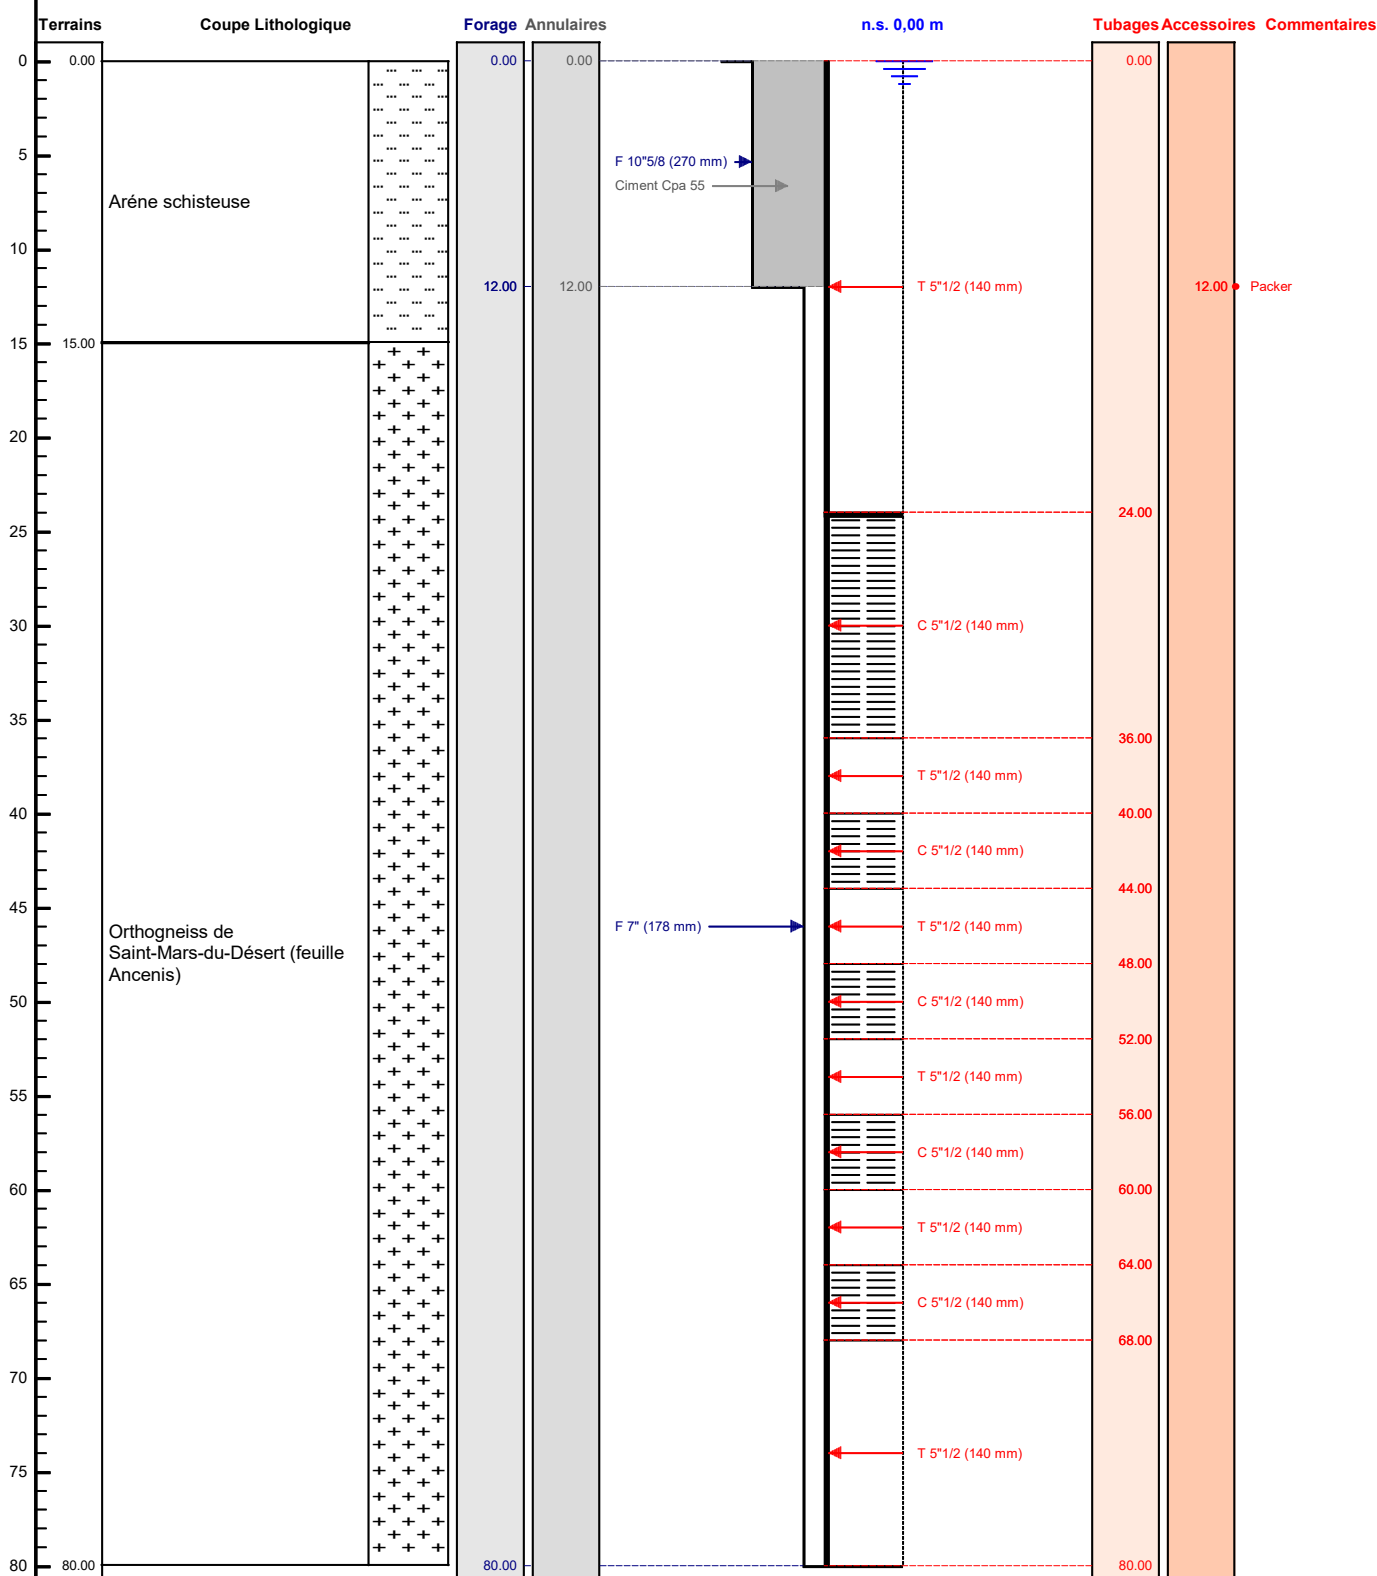

Le/...../..... à

CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE

Tampon et signature du chef d'entreprise
