

# DOSSIER TECHNIQUE

## FORAGE D'EAU

|                  |  |
|------------------|--|
| Entreprise:      | <b>BONNIER</b>   |
| Client:          | <b>GAEC REGEREAU</b><br>Le Haut Mecorbon<br>53320 MONTJEAN   |
| Maître d'oeuvre: | <b>IGEFOR ENVIRONNEMENT</b><br>26 le Tertre<br>35580 GUIGNEN |
| Exploitant:      | <b>GAEC REGEREAU</b><br>Le Haut Mecorbon<br>53320 MONTJEAN   |

Code National BSS :

N° Déclaration \*\* :

Police de l'eau \* :

\* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

\*\* N° d'enregistrement de déclaration préalable

**Lieu de l'ouvrage :** Le Haut Mécorbon  
53320 MONTJEAN

**Coordonnées :**      **Longitude**    407 166      **Latitude**    6 772 317      **Altitude :**      92.00    m  
**Zone**    Lambert-93 métrique

**Nombre de forages :** 1

**Date début de l'ouvrage :** 25/06/2022

**Resp. M. Ouvrage :**

**Date fin de l'ouvrage :** 26/06/2022

**Resp. M. Oeuvre :**

**Machine :**

**Resp. Chantier :**

**Date début pompage :**

**Niveau statique non perturbé :** 0.00    m

**Date fin de pompage :**

**Débit Maxi. d'essai :** 0.00    m3/h

**Nombre de nappes identifiées :**

**Rabattement correspondant :** 0.00    m

**Notes :**

## TRONCONS de L'OUVRAGE

## FORAGE D'EAU

**Client:** GAEC REGEREAU  
**Maître d'oeuvre:** IGEFOR ENVIRONNEMENT  
**Lieu de l'ouvrage :** Le Haut Mécorbon  
**53320** **MONTJEAN**

## LITHOLOGIE

| De    | à      | Libellé  |
|-------|--------|--|
| 0.00  | 10.00  | Altération argileuse   |
| 10.00 | 100.00 | NÉOPROTÉROZOÏQUE SUPÉRIEUR à CAMBRIEN - Briovérien supérieur - Siltites et argilites dominantes en voie d'altération |

## FORAGE

| De    | à      | Ø"  | Ømm    | Mode de forage | Fluide de forage |
|-------|--------|-----|--------|----------------|------------------|
| 0.00  | 10.00  | 10" | 254.00 | M.f.t.         | Air              |
| 10.00 | 100.00 | 7"  | 178.00 | M.f.t.         | Air              |

\* Reconnaissance

## TUBAGE

| De    | à      | Ø"    | Ømm    | Epais. | Ecra. | Nature du tubage | Type           | Slot | Vide % |
|-------|--------|-------|--------|--------|-------|------------------|----------------|------|--------|
| 0.00  | 30.00  | 5"1/2 | 140.00 | 0.00   |       | P.v.c.-lisse     | Tube-plein     |      |        |
| 30.00 | 90.00  | 5"1/2 | 140.00 | 0.00   |       | P.v.c.-lisse     | Crepine fentes |      |        |
| 90.00 | 100.00 | 5"1/2 | 140.00 | 0.00   |       | P.v.c.-lisse     | Tube-plein     |      |        |

## REMPLISSAGE

| De   | à     | Ø"    | Ømm    | Matériau | Nature | Méthode de pose | Texture | Gra. (mm) | Vol. m3 |
|------|-------|-------|--------|----------|--------|-----------------|---------|-----------|---------|
| 0.00 | 12.00 | 5"1/2 | 140.00 | Ciment   | Clk    | Sous pression   |         |           |         |

# FORAGE D'EAU

Client :

GAEC REGEREAU

Maitre d'oeuvre :

IGEFOR ENVIRONNEMENT

Localisation de l'ouvrage :

Le Haut Mécorbon

53320

MONTJEAN

Travaux réalisés :

du : 25/06/2022 au : 26/06/2022

1/1

Coordonnées de l'ouvrage :

Lambert-93 métrique

Longitude (X):

407 166

Latitude (Y):

6 772 317


Altitude sol (Z):

+92,000 m

Echelle : 1/503

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1

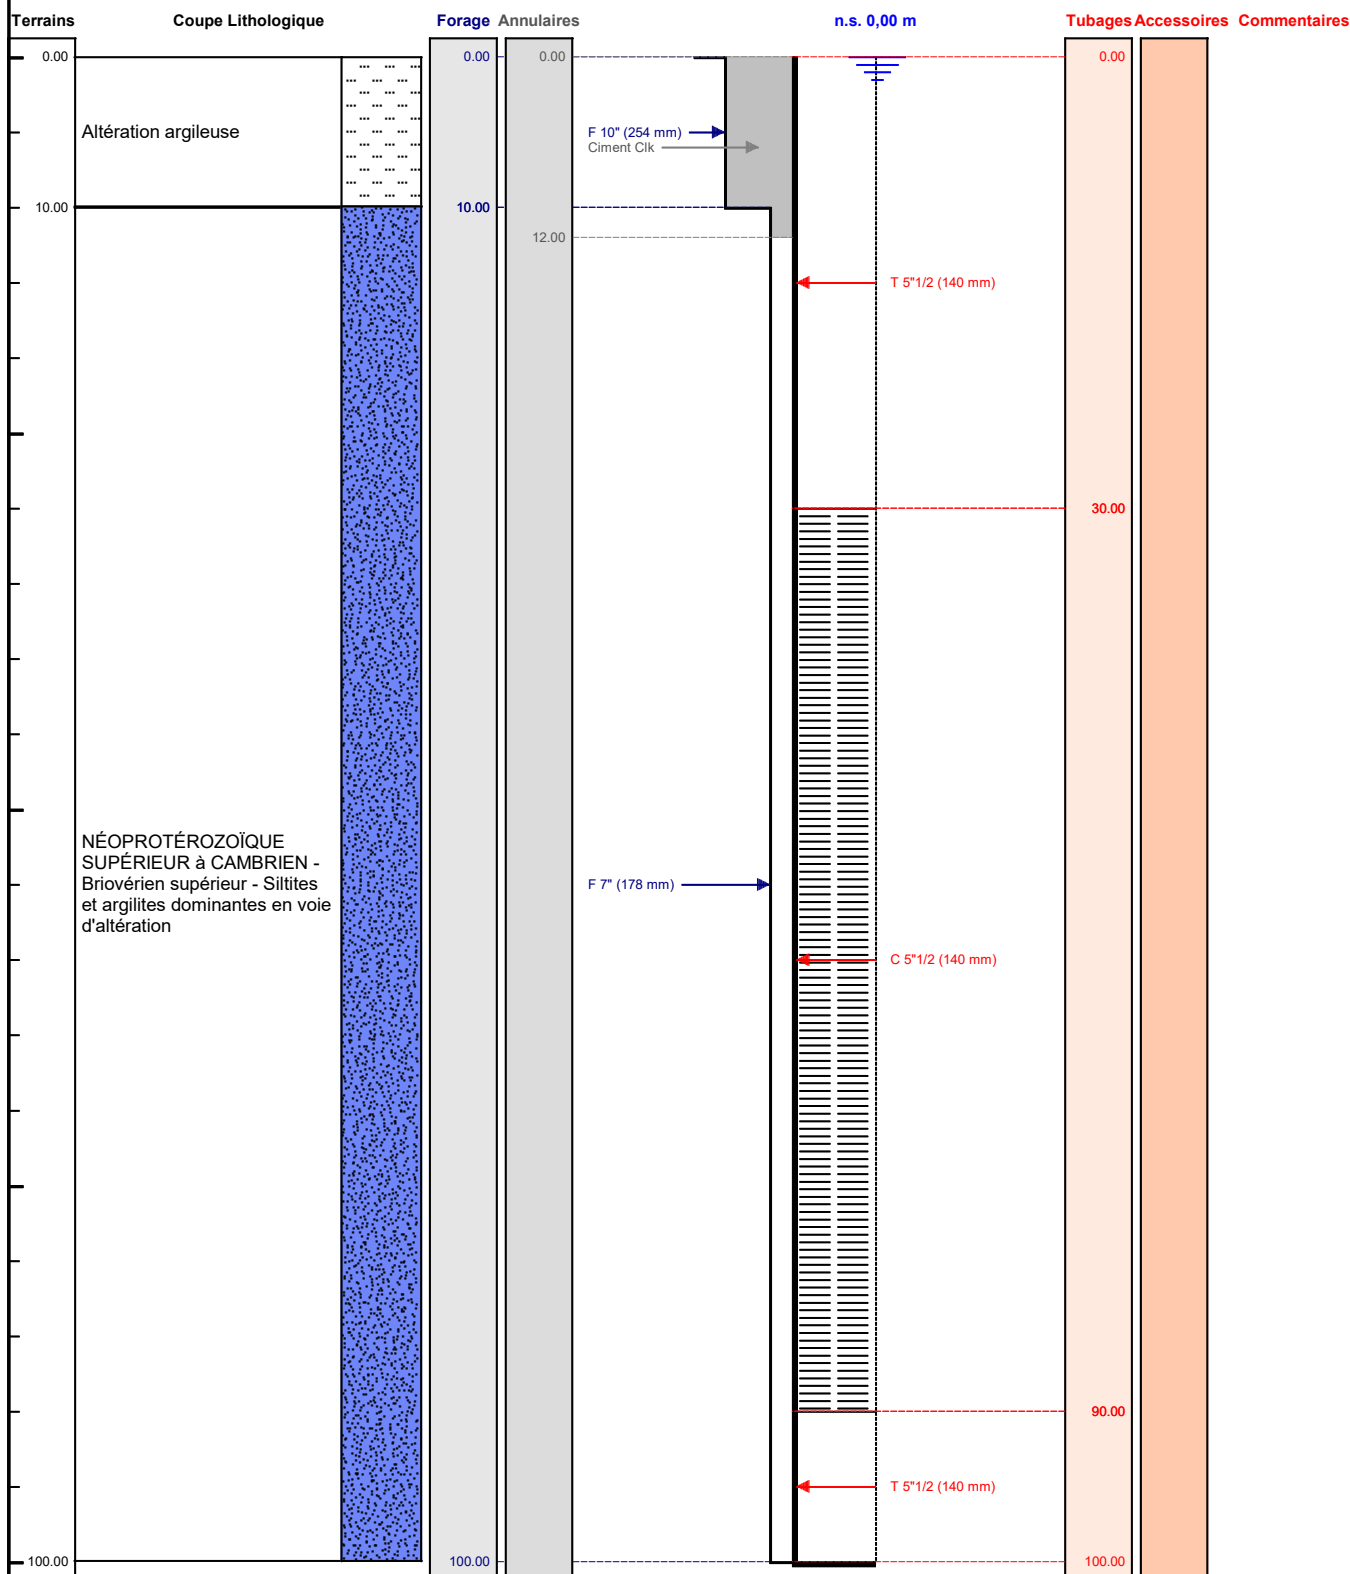

Le ...../...../..... à .....

CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE

Tampon et signature du chef d'entreprise
