

DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE D'EAU

| | |
|------------------|---|
| Entreprise: | GEOFOR 44 |
| Client: | GAEC LE ROCHER DU FRENE Le Frêne 44160 STE REINE DE BRETAGNE |
| Maître d'oeuvre: | IGEFOR ENVIRONNEMENT 26 le Tertre 35580 GUIGNEN |
| Exploitant: | GAEC LE ROCHER DU FRENE Le Frêne 44160 STE REINE DE BRETAGNE |

Code National BSS :

N° Déclaration ** :

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : Les brétins Bas
44160 STE REINE DE BRETAGNE

Coordonnées : **Longitude** 311 180 **Latitude** 6 719 390 **Altitude :** 21.00 m
Zone Lambert-93 métrique

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 01/09/2022 **Resp. M. Ouvrage :**

Date fin de l'ouvrage : 05/09/2022 **Resp. M. Oeuvre :**

Machine : **Resp. Chantier :**

Date début pompage : **Niveau statique non perturbé :** 0.00 m

Date fin de pompage : **Débit Maxi. d'essai :** 0.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées : **Rabattement correspondant :** 0.00 m

Notes :

TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU

| | | | |
|---------------------|-------------------------|-----------------------|--|
| Client: | GAEC LE ROCHER DU FRENE | | |
| Maître d'oeuvre: | IGEFOR ENVIRONNEMENT | | |
| Lieu de l'ouvrage : | Les brétins Bas | | |
| | 44160 | STE REINE DE BRETAGNE | |

LITHOLOGIE

| De | à | Libellé |
|------|-------|---|
| 0.00 | 5.00 | Aréne schisteuse |
| 5.00 | 70.00 | Roches métamorphiques : Zone broyée sud-armoricaine : Leucogranite à biotite et muscovite en feuillets syntectoniques |

FORAGE

| De | à | Ø" | Ømm | Mode de forage | Fluide de forage |
|------|-------|--------|--------|----------------|------------------|
| 0.00 | 5.00 | 10"5/8 | 270.00 | M.f.t. | Air |
| 5.00 | 70.00 | 7" | 178.00 | M.f.t. | Air |

* Reconnaissance

TUBAGE

| De | à | Ø" | Ømm | Epais. | Ecra. | Nature du tubage | Type | Slot | Vide % |
|-------|-------|-------|--------|--------|-------|------------------|----------------|------|--------|
| 0.00 | 28.00 | 5"1/2 | 140.00 | 0.00 | | P.v.c. | Tube-plein | | |
| 28.00 | 52.00 | 5"1/2 | 140.00 | 0.00 | | P.v.c. | Crepine fentes | 1.00 | |
| 52.00 | 70.00 | 5"1/2 | 140.00 | 0.00 | | P.v.c. | Tube-plein | | |

REMPLISSAGE

| De | à | Ø" | Ømm | Matériau | Nature | Méthode de pose | Texture | Gra. (mm) | Vol. m3 |
|------|-------|-------|--------|----------|--------|-----------------|---------|-----------|---------|
| 0.00 | 10.00 | 5"1/2 | 140.00 | Ciment | Cpa 55 | Sous pression | | | |

ACCESSOIRE

| De | à | Type d'accessoire |
|-------|-------|-------------------|
| 10.00 | 10.00 | Packer |

FORAGE D'EAU

Client :

GAEC LE ROCHER DU FRENE

Maitre d'oeuvre :

IGEFOR ENVIRONNEMENT

Localisation de l'ouvrage :

Les brétins Bas

44160

STE REINE DE BRETAGNE

Travaux réalisés :

du : 01/09/2022 au : 05/09/2022

1/1

Coordonnées de l'ouvrage :

Lambert-93 métrique

Longitude (X):

311 180

Latitude (Y):

6 719 390


Altitude sol (Z):

+21,000 m

Echelle : 1/352

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1

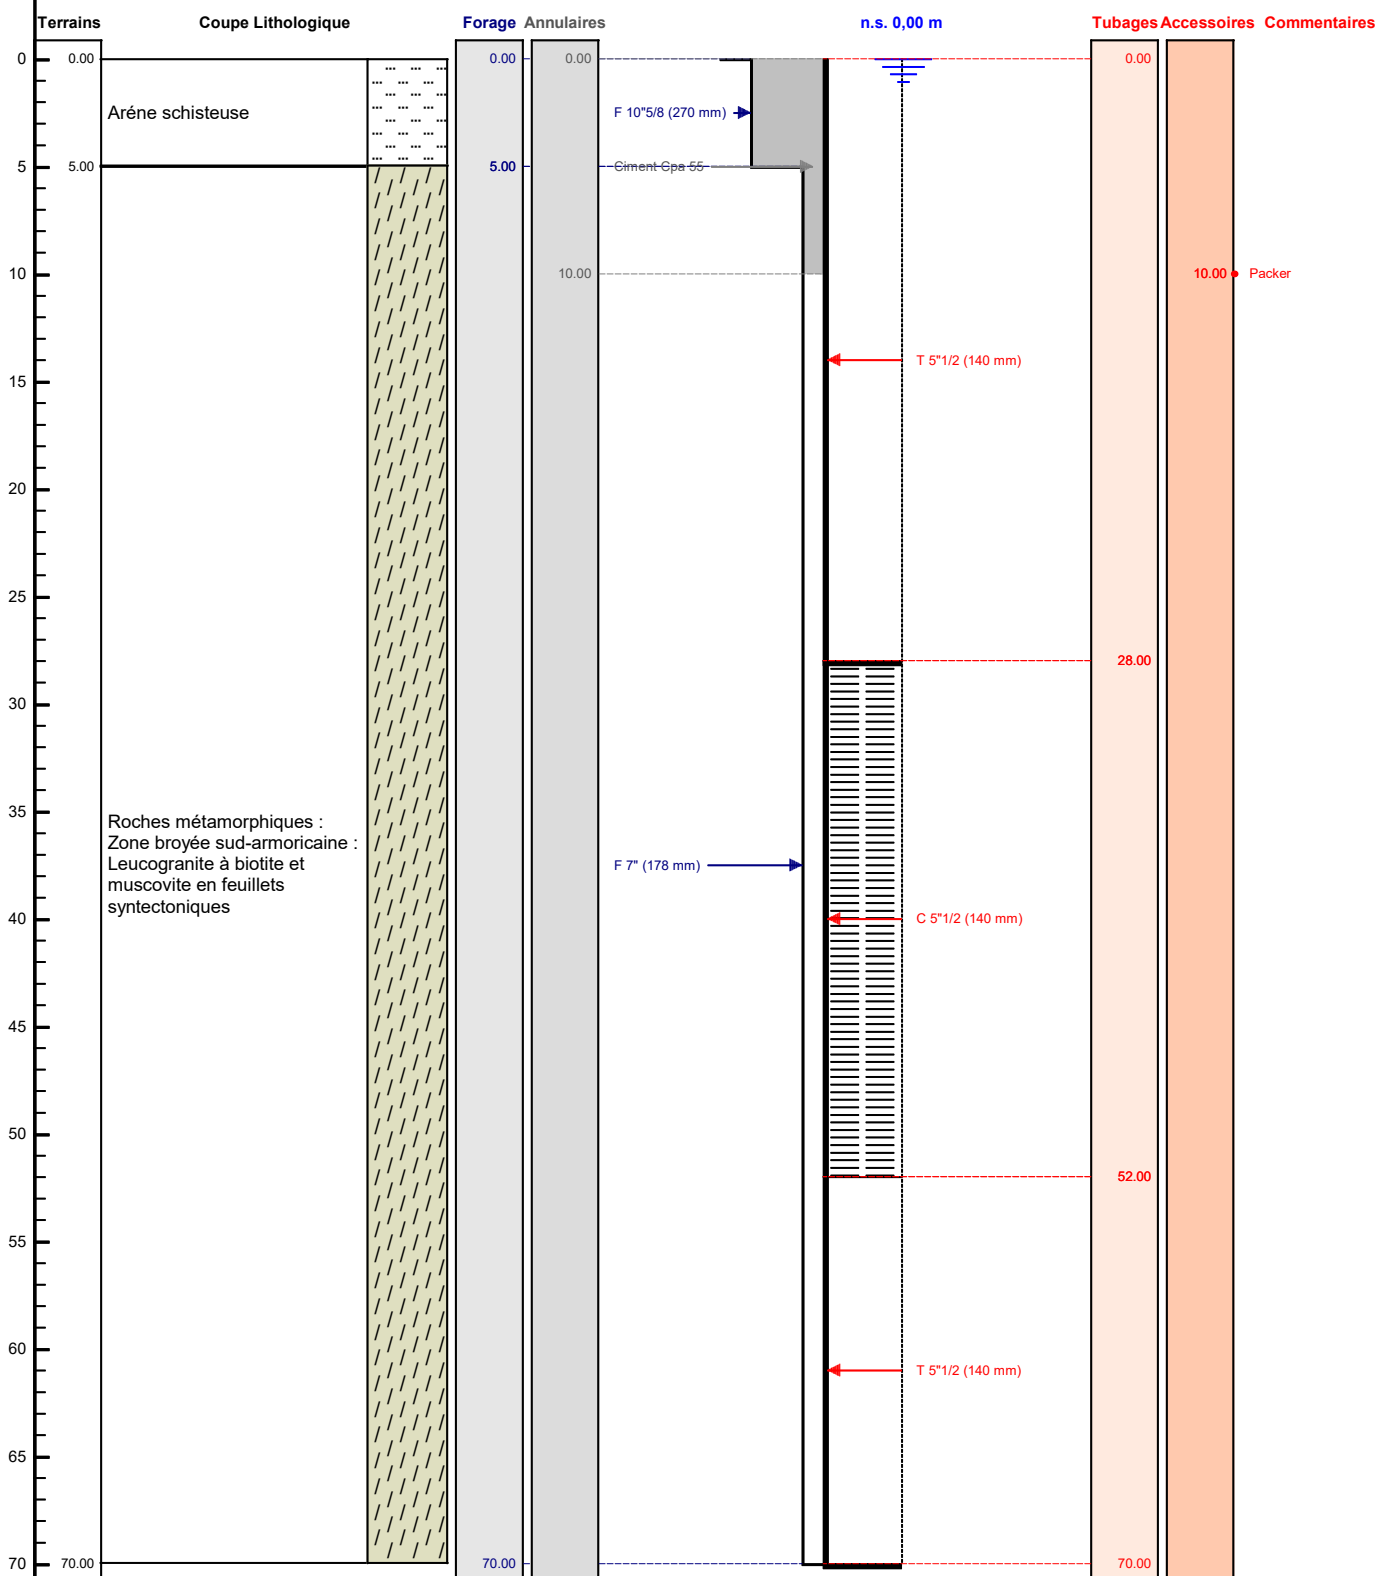

Le/...../..... à

CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE

Tampon et signature du chef d'entreprise
