

# DOSSIER TECHNIQUE

## FORAGE D'EAU

Entreprise:	GEOFOR 44
Client:	MAUVIEUX GAE 337 bis Les thivières 44521 COUFFE
Maître d'oeuvre:	IGEFOR ENVIRONNEMENT 26 le Tertre 35580 GUIGNEN
Exploitant:	MAUVIEUX GAE 337 bis Les thivières 44521 COUFFE

Code National BSS :

N° Déclaration \*\* :

Police de l'eau \* :

\* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

\*\* N° d'enregistrement de déclaration préalable

**Lieu de l'ouvrage :** 337 bis les Thivières  
44521 COUFFE

**Coordonnées :**      **Longitude**    375 078      **Latitude**    6 706 948      **Altitude :**      62.00    m  
**Zone**    Lambert-93 métrique

**Nombre de forages :** 1

**Date début de l'ouvrage :** 15/12/2022

**Resp. M. Ouvrage :**

**Date fin de l'ouvrage :** 16/12/2022

**Resp. M. Oeuvre :**

**Machine :**

**Resp. Chantier :**

**Date début pompage :**

**Niveau statique non perturbé :** 0.00    m

**Date fin de pompage :**

**Débit Maxi. d'essai :** 0.00    m3/h

**Nombre de nappes identifiées :**

**Rabattement correspondant :** 0.00    m

**Notes :**

## TRONCONS de L'OUVRAGE

## FORAGE D'EAU

Client: MAUVIEUX GAEI

Maître d'oeuvre: IGEFOR ENVIRONNEMENT

Lieu de l'ouvrage : 337 bis les Thivières

44521 COUFFE

## LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	5.00	Arène sablo-argileuse
5.00	57.00	Micaschistes à albite, mica blanc et biotite chloritisée (Série du Hâvre)

## FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	5.00	10"5/8	270.00	M.f.t.	Air
5.00	57.00	7"	178.00	M.f.t.	Air

\* Reconnaissance

## TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	28.00	5"1/2	140.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
28.00	57.00	5"1/2	140.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes	1.00	

## REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	12.00	5"1/2	140.00	Ciment	Cpa 55	Sous pression			

## ACCESSOIRE

De	à	Type d'accessoire
12.00	13.00	Packer

# FORAGE D'EAU

Client :

MAUVIEUX GAEI

Maitre d'oeuvre :

IGEFOR ENVIRONNEMENT

Localisation de l'ouvrage :

337 bis les Thivières  
44521 COUFFE

Travaux réalisés :

du : 15/12/2022 au : 16/12/2022

1/1

Coordonnées de l'ouvrage :

Lambert-93 métrique

Longitude (X): 375 078


Latitude (Y): 6 706 948

Altitude sol (Z): +62,000 m

Echelle : 1/286

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1

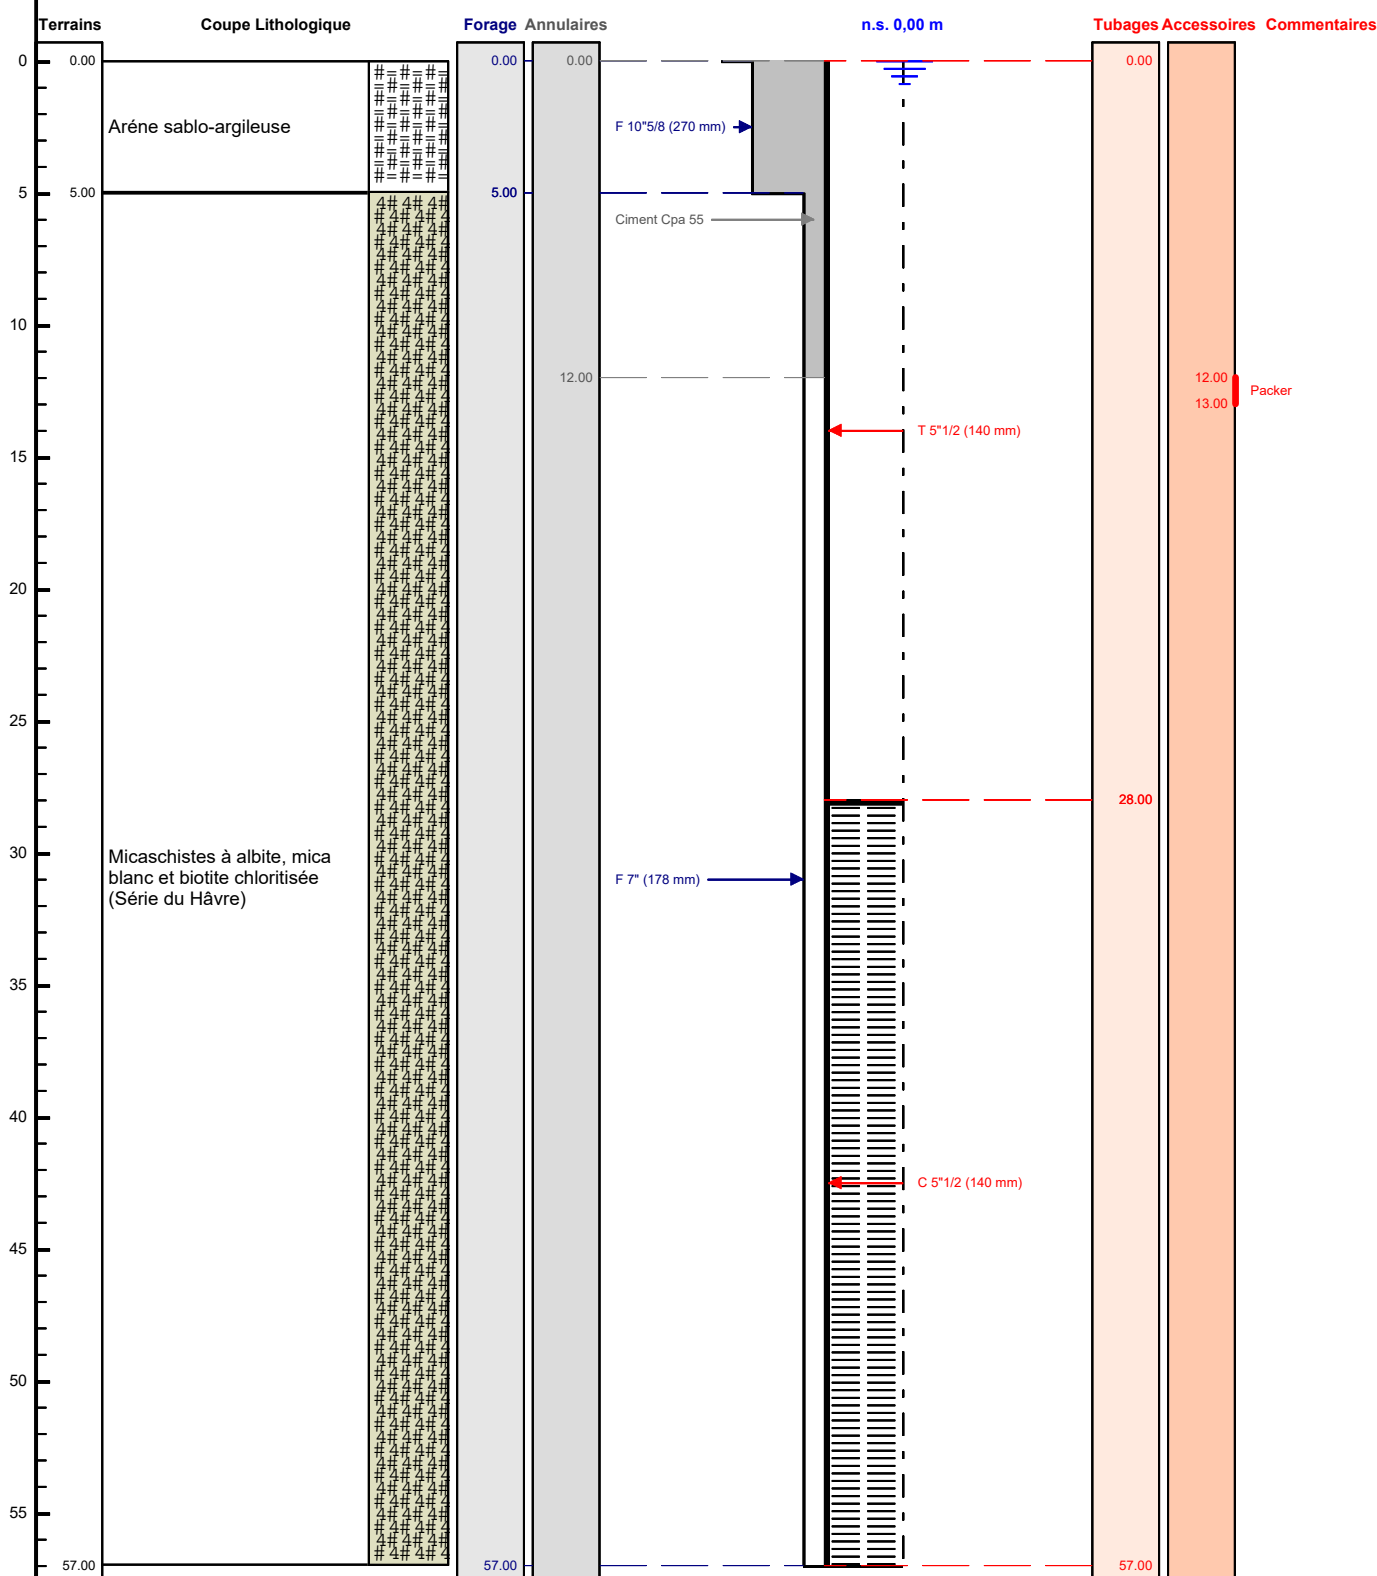

Le ...../...../..... à .....

CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE

Tampon et signature du chef d'entreprise
