

FORAGE D'EAU

Entreprise:	GEOFOR
Client:	GASNIER SERGE 4 allée du clos 49110 LA BOISSIERE SUR EVRE
Maître d'oeuvre:	IGEFOR ENVIRONNEMENT 26 le Tertre 35580 GUIGNEN
Exploitant:	GASNIER SERGE 4 allée du clos 49110 LA BOISSIERE SUR EVRE

N° Déclaration ** :

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : Allée du clos

49110 LA BOISSIERE SUR EVRE

Coordonnées : **Longitude** 391 922 **Latitude** 6 697 152 **Altitude :** 84.00 m

Zone Lambert-93 métrique

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 01/12/2023

Resp. M. Ouvrage :

Date fin de l'ouvrage : 02/12/2023

Resp. M. Oeuvre :

Machine :

Resp. Chantier :

Date début pompage :

Niveau statique non perturbé : 0.00 m

Date fin de pompage :

Débit Maxi. d'essai : 0.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées :

Rabatement correspondant : 0.00 m

Notes :

TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU

Client:	GASNIER SERGE
Maître d'oeuvre:	IGEFOR ENVIRONNEMENT
Lieu de l'ouvrage :	Allée du clos
	49110 LA BOISSIERE SUR EVRE

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	3.00	Altération argileuse
3.00	60.00	Micaschistes à chlorite, séricite, plus ou moins biotite et grenat : métapélites et méta-grauwackes

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	10.00	10"	254.00	M.f.t.	Air
10.00	60.00	6"1/2	165.00	M.f.t.	Air

* Reconnaissance

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	30.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.-lisse	Tube-plein		
30.00	60.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.-lisse	Crepine fentes		

REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	10.00	4"7/8	125.00	Ciment	Cpa 55	Sous pression			

FORAGE D'EAU

Client :

GASNIER SERGE

Maitre d'oeuvre :

IGEFOR ENVIRONNEMENT

Localisation de l'ouvrage :

Allée du clos
49110 LA BOISSIERE SUR EVRE

Travaux réalisés :
du : 01/12/2023 au : 02/12/2023

1/1


Coordonnées de l'ouvrage :

Lambert-93 métrique
Longitude (X): 391 922
Latitude (Y): 6 697 152
Altitude sol (Z): +84,000 m

Echelle : 1/302

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1

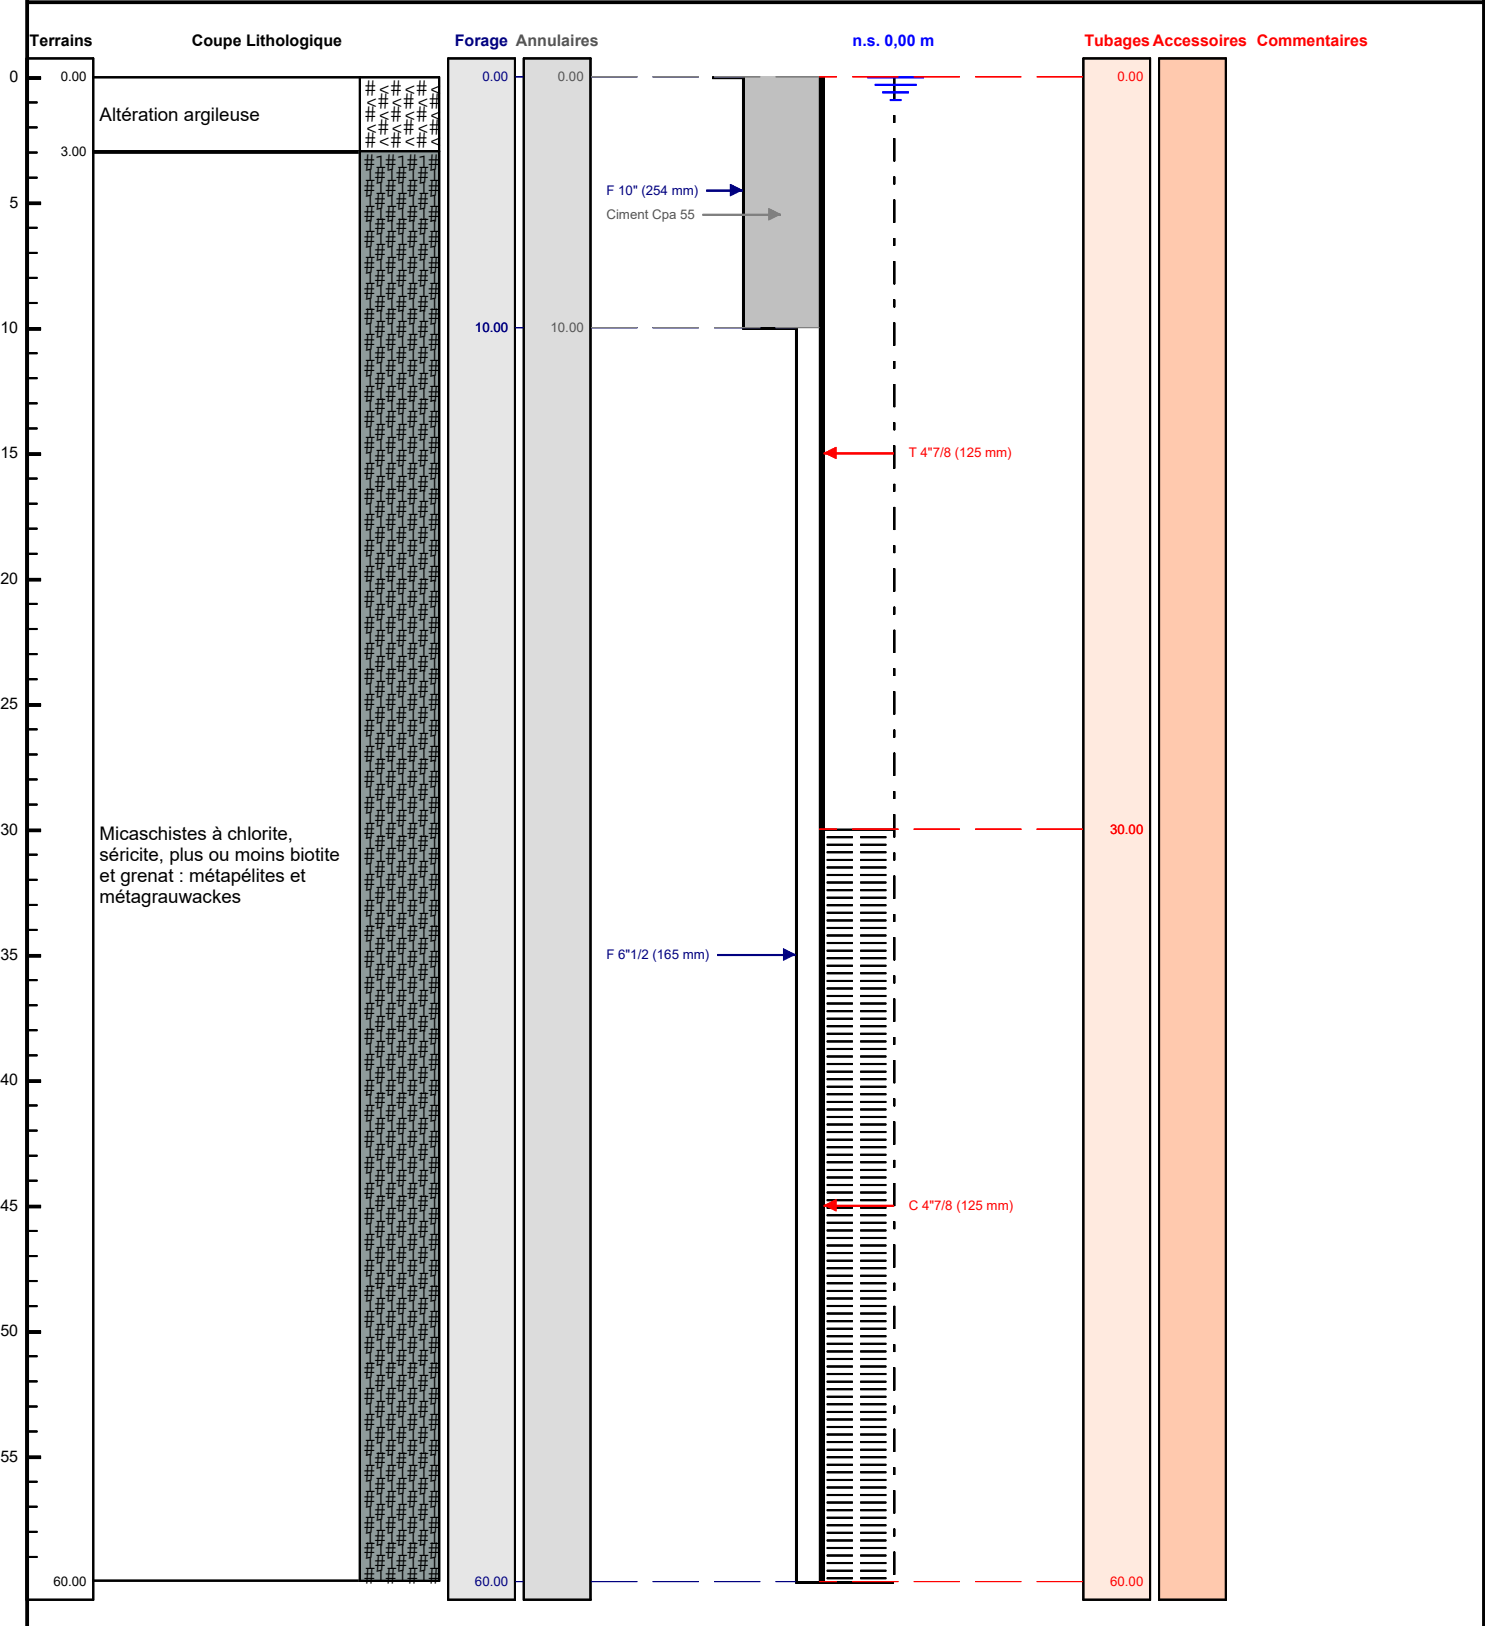

Le/...../..... à
CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE
Tampon et signature du chef d'entreprise
