

# DOSSIER TECHNIQUE

## FORAGE D'EAU

Entreprise: **BONNIER FORAGES**

Client: **EARL SAULOUP**  
Les haies  
49220 VERN D ANJOU

Maître d'oeuvre: **IGEFOR**  
  
35580 GUIGNEN

Exploitant:  
  
26 le Tertre  
35580 GUIGNEN

Code National BSS :

N° Déclaration \*\* :

Police de l'eau \* :

\* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

\*\* N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : Les mortiers  
49220 VERN D ANJOU

Coordonnées :      **Longitude**    413 169      **Latitude**    6 729 624      Altitude :    49.00    m  
**Zone**    Lambert-93 métrique

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 15/06/2024

Resp. M. Ouvrage :

Date fin de l'ouvrage : 15/06/2024

Resp. M. Oeuvre :

Machine :

Resp. Chantier :

Date début pompage :      Niveau statique non perturbé :    0.00    m

Date fin de pompage :      Débit Maxi. d'essai :    0.00    m3/h

Nombre de nappes identifiées :      Rabattement correspondant :    0.00    m

Notes :

## TRONCONS de L'OUVRAGE

## FORAGE D'EAU

Client: EARL SAULOUP

Maître d'oeuvre: IGEFOR

Lieu de l'ouvrage : Les mortiers

49220 VERN D ANJOU

## LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	10.00	Formation résiduelle d'altérites et colluvions limoneux des versants
10.00	110.00	Quartzites et siltites en alternance du BRIOVERIEN

## FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	10.00	10"	254.00	M.f.t.	Air
10.00	110.00	5"1/2	140.00	M.f.t.	Air

\* Reconnaissance

## TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	30.00	5"1/2	140.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
30.00	110.00	5"1/2	140.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes		

## REMPLISSAGE


De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	20.00	5"1/2	140.00	Ciment	Cpa 55	Gravitaire			

FORAGE D'EAU

Client :  
Maitre d'oeuvre :  
Localisation de l'ouvrage :  
49220 VERN D ANJOU

Travaux réalisés :  
du : 15/06/2024 au : 15/06/2024  
Coordonnées de l'ouvrage :  
Lambert-93 métrique  
Longitude (X): 413 169  
Latitude (Y): 6 729 624  
Altitude sol (Z): +49,000 m

Echelle : 1/553 Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus) Nombre de forages : 1

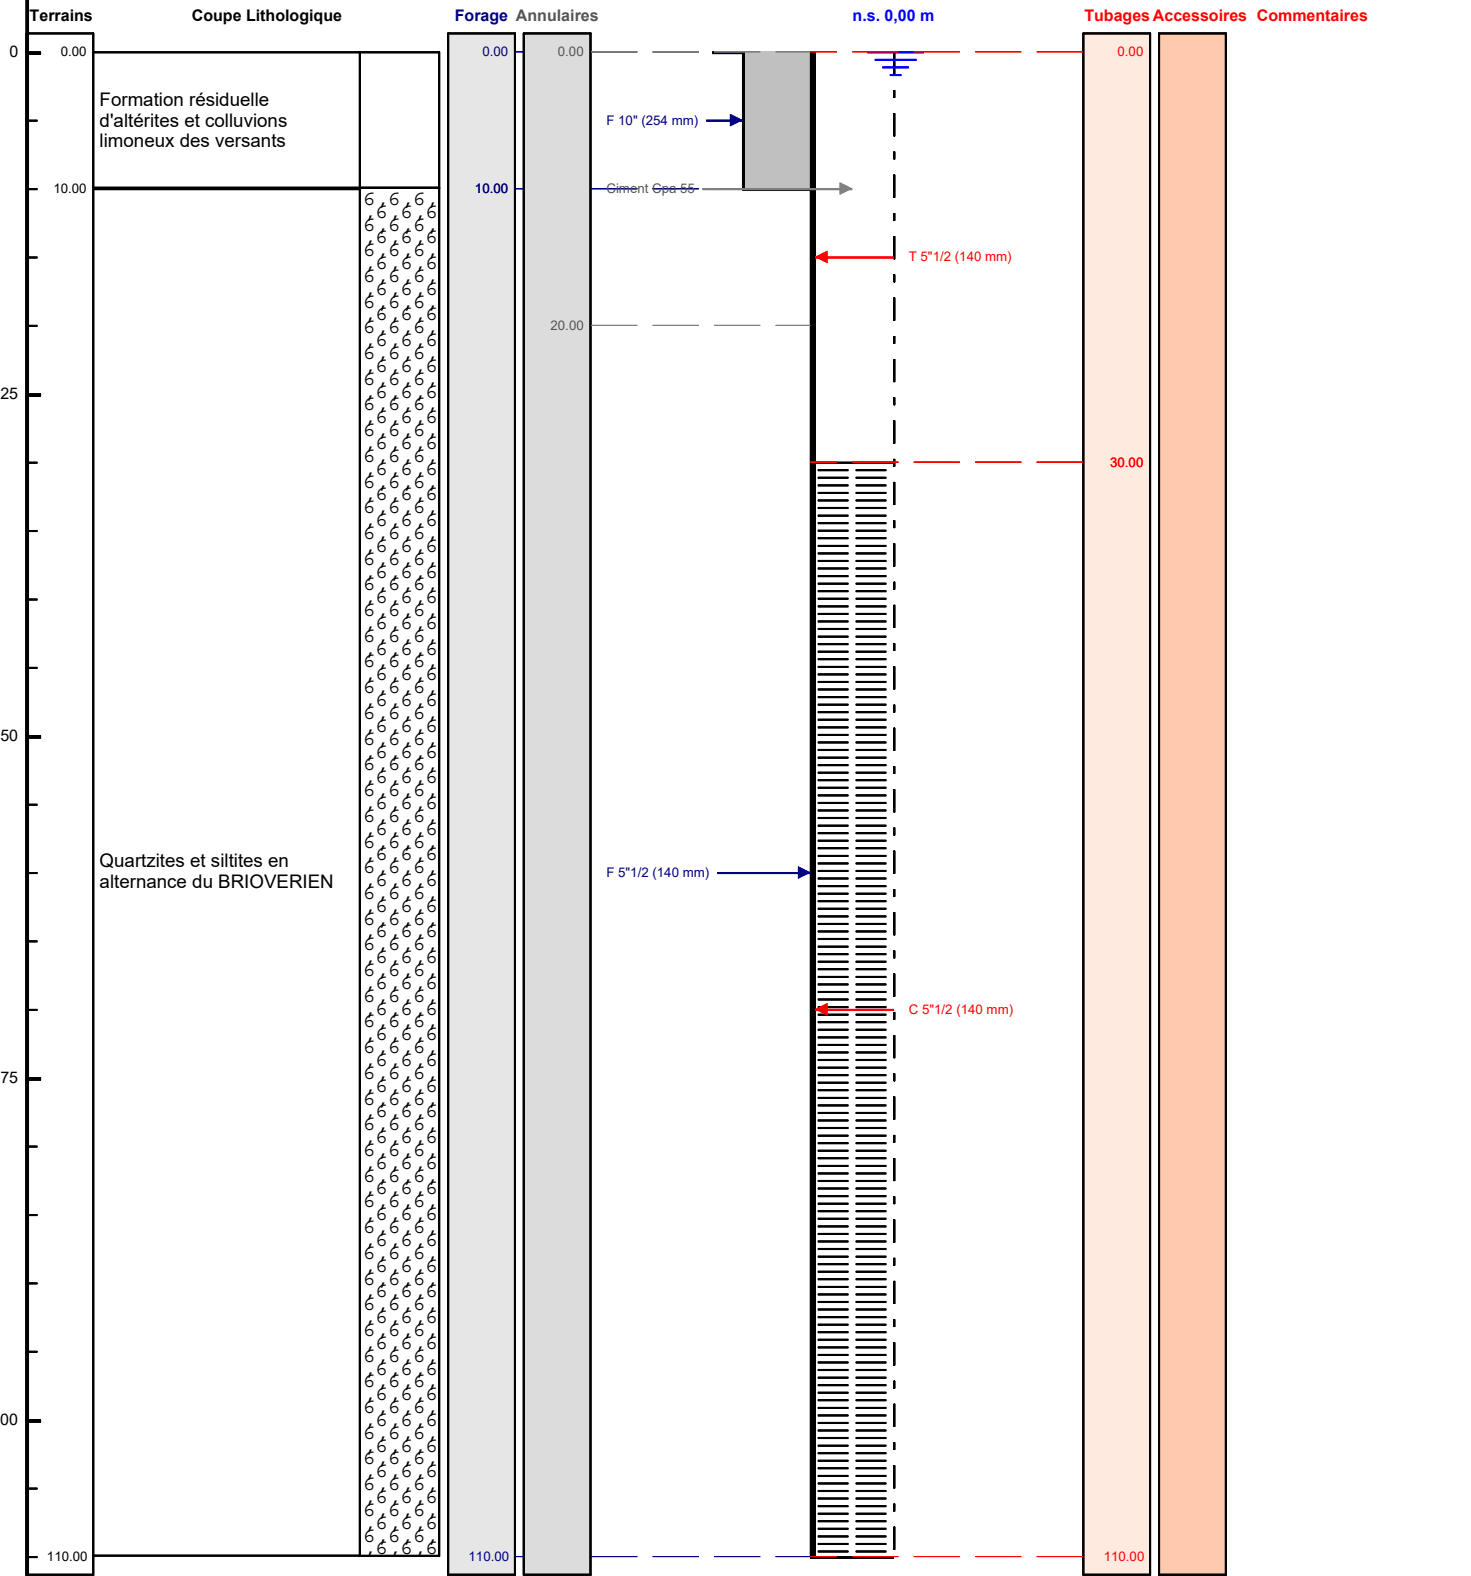

Le ...../...../..... à .....  
CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE  
Tampon et signature du chef d'entreprise
