



Plantation

Projet

Boisement en essences feuillus (1400 Tiges/ha) de terre agricole, terre labourée (dernière récolte prévu été 2025) et prairie. 10ha 35a 52ca surface cadastrale.

Situation

Vieilleville (44116) lieu-dit le château, parcelle cadastrale XD 29, XD 153 et XD 157

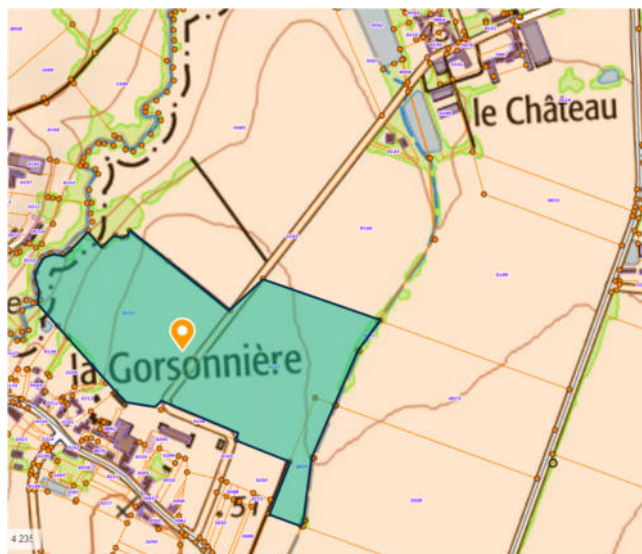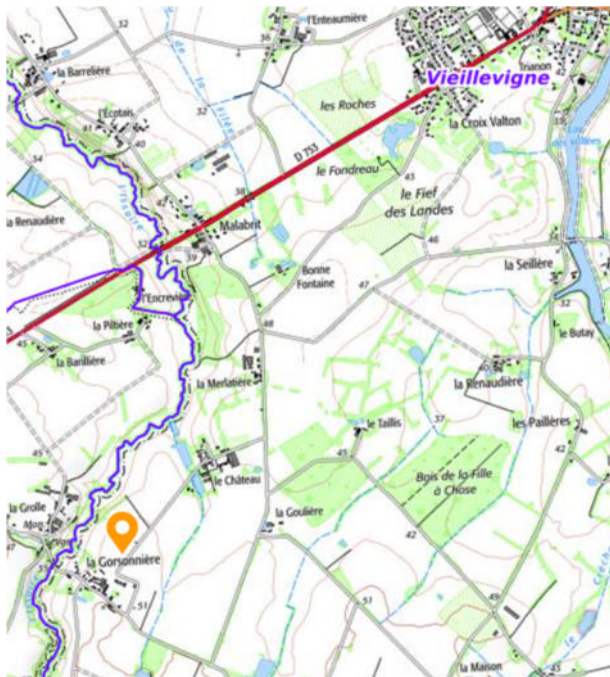


Implantation

Implantation d'une tournière de 6 m de large sur l'ensemble des périmètres.

Plantation en plein en ligne. Ligne orientée dans le sens de la plus grande pente ce qui correspond à la limite nord des parcelles sauf l'extrémité sud orientation dans le sens de la plus grande longueur (selon schéma ci-dessous). Ecartement : 2.5 m entre les lignes, 2 m sur la ligne.

Implantation d'un réseau de cloisonnements d'exploitation de 5 m de large et 17.5 m d'entraxe.

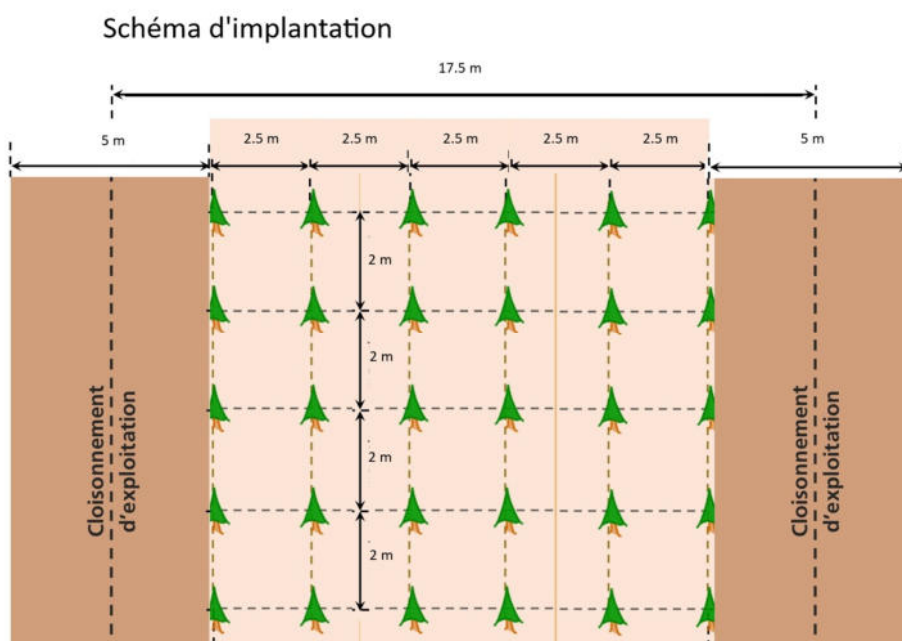

Description des travaux

Préparation de sol : À la suite de l'activité agricole une semelle de labour est présente à environ 50 cm de profondeur.

Sous solage en ligne, 1 ligne tous les 2.5m, selon schéma d'implantation sauf cloisonnements et tournières. Période d'intervention septembre/octobre 2025.

Engrillagement : fourniture et pose d'un grillage de protection contre le chevreuil.

Hauteur minimum 1.5m.

Aménagement de X portes pour accès tracteur.

Raccord sur grillage riverain déjà existant.

Fourniture des plants :

Essences	Provenance	Quantité (unité)
Chêne Sessile	QPE 311 POITOU CHARENTE ou QPE 362 GASCOGNE	10150
Cormier	SDO 900 FRANCE	1450
Erable champêtre		1450
Merisier	PAV 901 FRANCE	1450

Racine nue ou godet selon fournisseur.

Si racine nue, mise en jauge le temps de la plantation, si godet stockage sous abri.

Réception formalisée

Plantation : au moins 3 mois après le sous-solage.

Plantation sur la ligne de sous-solage selon plan d'implantation 2m sur la ligne.

L'introduction du mélange d'essence se fera sur la ligne comme suit : 7 chênes/3 cormiers/7 chênes/3 érables/7 chênes/ 3 merisiers/...

Entretien : Dégagement mécanique des plants, si besoin 1 fois par an pendant 5 ans

Broyage d'un interligne/2

Dégagement des plants sur la ligne à la débrousailluse
